



وَزَارَةُ التَّعْلِيمِ الْعَالِيِّ وَالبَحْثِ الْعِلْمِيِّ

**المشروعات الجارى تنفيذها بوزارة التعليم العالى
والمراكز والمعاهد البحثية والمتوقع الانتهاء منها فى ٢٠٢٠**

الموقف فى أغسطس ٢٠١٩

بيان المحتويات

ص ٣

أولاً: المشروعات الكبرى على المستوى المركزي

ص ١١٥

ثانياً: المشروعات الكبرى على مستوى المراكز والمعاهد البحثية

أولاً:

المشروعات الكبرى على المستوى المركزي

الجامعة المصرية - اليابانية

الجامعة المصرية - اليابانية (المرحلة الأولى)		وزارة الدفاع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
	وزارة التعليم العالي	الجهة المستفيدة
	إدارة المهندسين العسكريين	الجهة المنقذة
	١.٢٣٨ مليار جنيه	القيمة التقديرية
	١.٢٣٨ مليار جنيه	المخصص
	١.١٩٩ مليار جنيه + ٢٩ مليون ق.د	الوارد حتى تاريخه
	٢٠١٦ / ١٠ / ٠١	تاريخ بدء المشروع
	تم التمهيد	تاريخ التمهيد
	١٠٠ %	نسبة التنفيذ الفعلية

المرحلة الثانية

المشروع على مساحة ٨٤٠ ألف م^٢ بما يعادل ٢٠٠ فدان وتتكون المرحلة الأولى من :

- أنفاق رئيسية خدمية بطول ١ كم وأبعاد ٧" × ٥.١ م
- أنفاق فرعية خدمية بطول ١.٣ كم وأبعاد ٣" × ٢ م
- غرفة التحكم المركزية بإجمالي مساحة بنائية ١٩٥ م^٢
- حدة (٥) محطة فرعية (التبريد - مولدات القدرة الكهربائية الاحتياطية - موزع جهد متوسط - ٢ " محطة توزيع جهد منخفض) بإجمالي مساحة بنائية ٢٩٠٠ م^٢
- حدة (٣) خزان (مياه الري ٣٩٠٠٠ - مياه أبراج التبريد المركزية ٣٤٣٠٠٠ - مياه الشرب والحريق ٣٥٣٠٠٠) بإجمالي سعة ١٢٠٠٠ م^٣
- أعمال شبكات المرافق (شبكة الصرف - شبكة الري - شبكة صرف المطر - شبكة الحريق - شبكة التغذية - شبكة التهوية)

مكونات
المشروع





جامعة الجلالة



جامعة الجلالة

الهيئة الهندسية لقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى



الجهة المستفيدة	القوات المسلحة
القيمة التقديرية	٦.٣ مليار جنيه
المورد	٤.٣ مليار جنيه
تاريخ بدء المشروع	٢٠١٨ / ٣ / ٢٠
المراحل	الأسبقية الأولى
تاريخ التمهيد	الأسبقية المعالجة
نسبة التنفيذ	الموقع العام ٢٠١٩ / ٧ / ٣١
	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
	٥٥ %
	٤٠ %


المشروع على مساحة (١٧٣,٥) فدان :

- ١- عدد (١٤) كلية (العلوم الإدارية - العلوم الاجتماعية والإنسانية - الإعلام والاتصال - الهندسة - العمارة - الطب - التمريض - الغذاء والصناعات الغذائية - الفنون - العلوم - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - العلوم الصحية التطبيقية - الصيدلة) .
- ٢- مبنى إدارة الجامعة
- ٣- المستشفى الجامعي (طاقة ٤٠٠ سرير)
- ٤- مركز المؤتمرات
- ٥- سكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس - سكن الطاقم وعضوات هيئة التدريس - المسجد
- ٦- الأكاديمية العليا للعلوم (مرحلة مستقبلية)
- الأسبقية المعالجة : مبنى إدارة الجامعة - كليات (العلوم الإدارية - العلوم الاجتماعية والإنسانية - الإعلام والاتصال)
- الأسبقية الأولى : كليات [التمريض - الهندسة - الطب - العمارة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - العلوم الصحية التطبيقية - الصيدلة - الفنون - العلوم - الغذاء والصناعات الغذائية - مركز المؤتمرات - المستشفى الجامعي (هيلز خرساني)]
- المرحلة المستقبلية : الأكاديمية العليا للعلوم

المكونات
 الرئيسية
 للمشروع



جامعة الجلالة

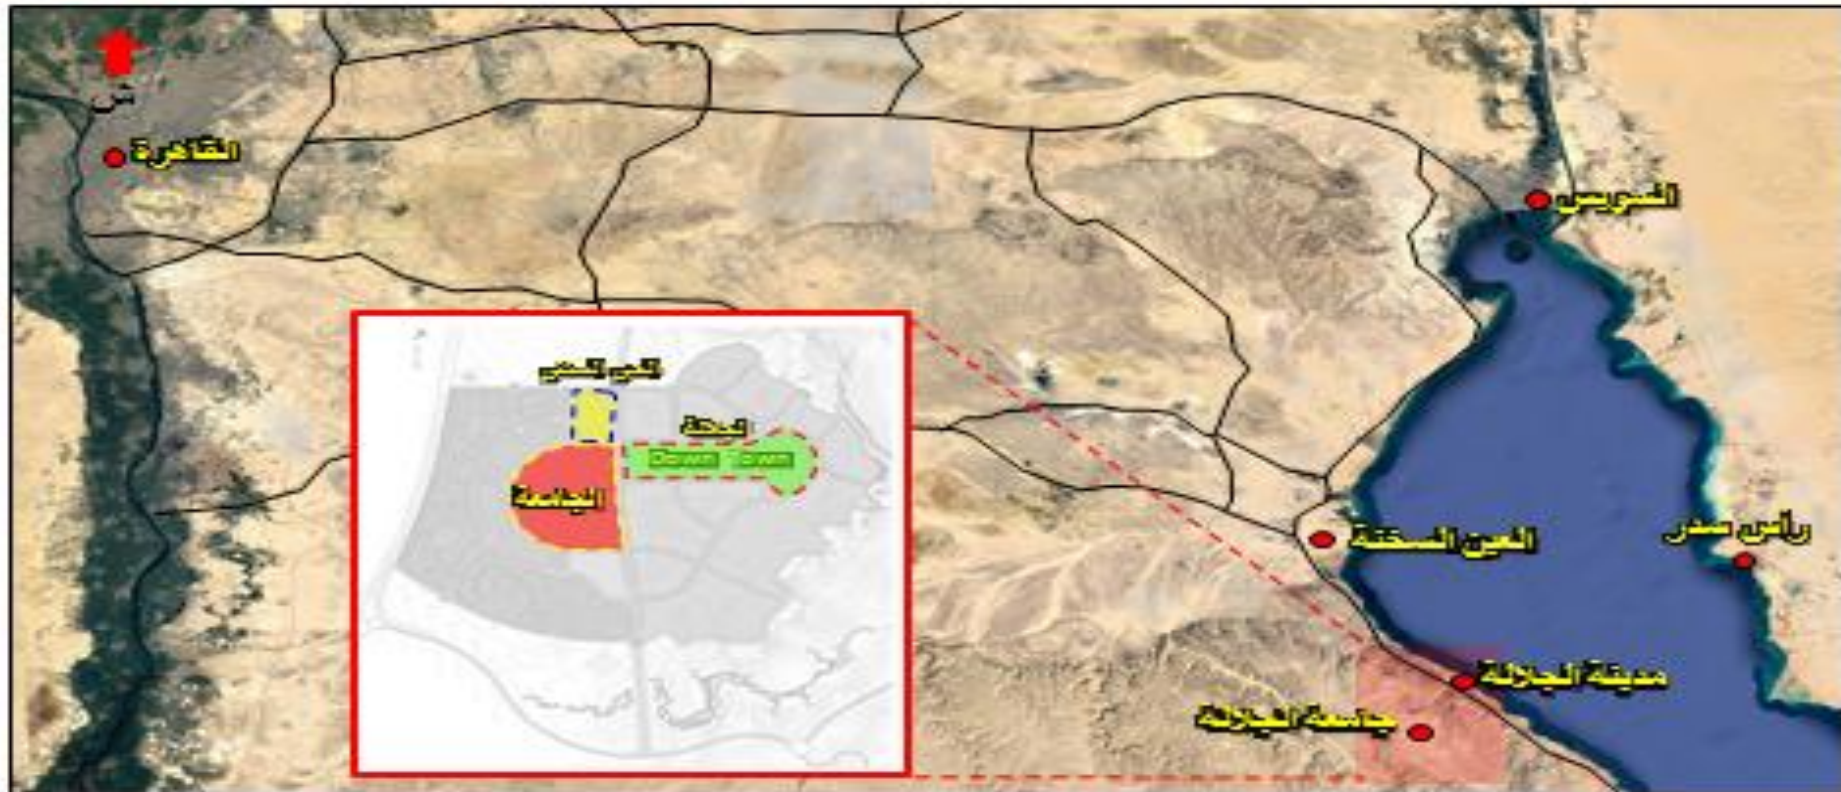

الموقع الجغرافي

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدامة المشروعات الكبرى
 جامعة الجلالة



الأسبقية العاجلة

١	كلية العلوم الاقتصادية والإحصائية
٢	كلية الإعلام والاتصال
٣	مبنى إدارة الجامعة
٤	كلية العلوم الإدارية

الأسبقية الأولى

٥	قاعة المؤتمرات
٦	المسجد
٧	سكن الطلبة والمدرسين
٨	كلية الغذاء والصناعات الغذائية
٩	كلية الفنون
١٠	كلية العمارة
١١	كلية الهندسة
١٢	كلية العلوم
١٣	كلية العلوم الصحية التطبيقية
١٤	كلية العلاج الطبيعي
١٥	كلية طب الأسنان
١٦	كلية الطب
١٧	كلية التمريض
١٨	كلية الصيدلة
١٩	المستشفى الجامعي ٤٠٠ سرير
٢٠	سكن الطالبات والمدرسات

الموقع العام على مساحة ١٧٣.٥ فدان

الأكاديمية العليا للعلوم (مرحلة مستقبلية)

٢١	الأكاديمية العليا للعلوم
----	--------------------------

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات العسكرية
 جامعة الجلالة



الموقع العام على مساحة ١٧٣.٥ فدان

الأسبقية العاجلة ■

١	مبنى إدارة الجامعة
٢	كلية العلوم الإدارية
٣	كلية العلوم الإحصائية والإحصائية
٤	كلية الإعلام والاتصال

الأسبقية الأولى ■

٥	كلية الهندسة
٦	كلية التمريض
٧	كلية الطب
٨	كلية الصيدلة
٩	كلية الغذاء والصناعات الغذائية
١٠	كلية الفنون
١١	كلية العلوم
١٢	كلية طب الأسنان
١٣	كلية العلاج الطبيعي
١٤	كلية العلوم الصحية التطبيقية
١٥	كلية الصيدلة
١٦	قاعة المؤتمرات
١٧	المسجد
١٨	سكن الطلبة والمدرسين
١٩	سكن الطالبات والمدرسات
٢٠	المستشفى الجامعي ٤٠٠ سرير

الأكاديمية العليا للعلوم (مرحلة مستقلة) ■

٢١	الأكاديمية العليا للعلوم
----	--------------------------



جامعة القادسية

الهيئة الهندسية لأغوات المساحة
إدارة المشروعات الكبرى

بيان موقف مشروع جامعة القادسية


م	عناصر المشروع	المرحلة	الملاحظات	المساحة	الموقف التقني	ملاحظات
١	شبهات الموقع العام	مكرر			١٠ %	
٢	مبنى إدارة الجامعة	الشرق	أرضي و ٣ مكرر	يسطح ٤٩٠٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٨٤٠٠ م ^٢	١٠٠ %	
٣	مبنى كلية العلوم الإدارية	ساكنات	أرضي و ٣ مكرر	يسطح ٢٧٢٥ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٠٩٠٠ م ^٢	١٠٠ %	
٤	مبنى كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية	الغربي	أرضي و ٣ مكرر	مساحة إجمالية ٥١٠٠ م ^٢	١٠٠ %	
٥	مبنى كلية الإعلام والاتصال		أرضي و ٣ مكرر	مساحة إجمالية ٨٥٠٠ م ^٢	١٠٠ %	
٦	مبنى كلية التمريض	المستقل	أرضي و ٣ مكرر	يسطح ٤٩٠٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٨٤٠٠ م ^٢	٩٩ %	
٧	مبنى كلية الطب	الدولية الهندسية	أرضي و ٣ مكرر	يسطح ٥١٠٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٠٤٠٠ م ^٢	٩٩ %	
٨	مبنى كلية طب الأسنان	الشرق	أرضي و ٣ مكرر	يسطح ٥١٠٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٠٤٠٠ م ^٢	١٠٠ %	



جامعة القادسية

الهيئة الهندسية لقوات المساحة
إدارة المشروعات الكبرى

م	عناصر المشروع	الضربة المتخذة	المكونات	المساحة	الموقف التقني	ملاحظات
٩	مبنى كلية العلوم الصحية التطبيقية	الشرق	أرضي و ٤ متكرر	بمسطح ٤٦٦٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٣٣٠٠ م ^٢	٩٥%	
١٠	مبنى كلية العلاج الطبيعي		أرضي و ٣ متكرر	بمسطح ٤٥٢٥ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٨١٠٠ م ^٢	٩٥%	
١١	مبنى كلية العلوم		أرضي و ٤ متكرر	بمسطح ٤٦٦٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٣٣٠٠ م ^٢	١٠٠%	
١٢	مبنى علمي الهندسة والعمارة	العامية متكرر	بغروم وأرضي و ٣ متكرر	بمسطح ٤٥١٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٢٥٥٠ م ^٢	١٠٠%	
١٣	مبنى كلية القانون		بغروم وأرضي و ٣ متكرر	بمسطح ٤٤٠٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٤٥٠٠ م ^٢	٩٨%	
١٤	مبنى كلية الصيدلة	العامية	أرضي و ٣ متكرر	بمسطح ٤٤٠٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٩٦٠٠ م ^٢	٩٠%	
١٥	مبنى كلية الغذاء والصناعات الغذائية		أرضي و ٣ متكرر	بمسطح ٤٢٩٠ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٧١٥٠ م ^٢	٩٠%	
١٦	مبنى قاعة المؤتمرات	ساحريات	أرضي و ٣ متكرر	بمسطح ٩٩٦٥ م ^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٧٨٥٥ م ^٢	٩٠%	



جامعة الجلالة

الهيئة الهندسية لقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

م	المبنى	إجمالي المسطح (م ^٢)
١	مبنى كلية العلوم الإدارية	١٠٩٠٠
٢	مبنى كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية	٥١٠٠
٣	مبنى كلية الإعلام والاتصال	٨٥٠٠
٤	مبنى كلية التمريض	١٨٤٠٠
٥	مبنى كلية الطب	٢٠٤٠٠
٦	مبنى كلية طب الأسنان	٢٠٤٠٠
٧	مبنى كلية العلوم الصحية التطبيقية	٢٣٣٠٠
٨	مبنى كلية العلاج الطبيعي	١٨١٠٠
٩	مبنى كلية العلوم	١٨١٠٠
١٠	مبنى كليتي الهندسة والعمارة	٢٢٥٥٠
١١	مبنى كلية الفنون	٢٤٥٠٠
١٢	مبنى كلية الصيدلة	١٩٦٠٠
١٣	مبنى كلية الغذاء والصناعات الغذائية	١٩٦٠٠
الإجمالي		٢٢٩٤٥٠

مساحات منشآت الجامعة



جامعة الجلالة
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى

م	المبنى	إجمالي المسطح (م ^٢)
١	مبنى الإدارة	١٨٤٠٠
٢	مبنى قاعة المؤتمرات	٢٧٨٥٥
٣	المسجد	١٣٤٠
٤	المستشفى الجامعي طاقة ٤٠٠ سرير	٩٠٠٠٠
الإجمالي		١٠٧٥٩٥

م	المبنى	إجمالي المسطح (م ^٢)
١	عدد (٢) مبني نموذج (أ) أسلحة بإجمالي ٢٠٠ غرفة	١١٣٤٠
٢	عدد (٢) مبني نموذج (ب) سكن للطلقات بإجمالي ٣٢٠ غرفة	١٥٩٠٠
٣	عدد (٢) مبني نموذج (ب - بدوم) سكن للطلقات بإجمالي ٣٢٠ غرفة	١٥٩٠٠
٤	عدد (٢) مبني نموذج (ج) سكن أسلحة بإجمالي ١٩٩ غرفة	٢٥٣٩٠
الإجمالي		٩٧٤٣٠

م	المبنى	إجمالي المسطح (م ^٢)
١	الأكاديمية العليا العلوم	٣٣٠٠٠
٢	جامعة العلوم التطبيقية قطعة أرض رقم (١) بمساحة ١٧.٣ فدان	٧٢٩٩٠
٣	جامعة العلوم التطبيقية قطعة أرض رقم (٢) بمساحة ٢١.٢٥ فدان	٨٩٢٥٠
الإجمالي		١٩٥٢٤٠

مسطحات منشآت الجامعة



الأسبقية العاجلة

جامعة الجلالة
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى



مبنى إدارة الجامعة (أرضي و ٣ مكرر - بمسطح ٤٦٠٠ م^٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٨٤٠٠ م^٢)

جامعة الجلالة
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى



مبنى كلية العلوم الإدارية (أرضى و٣ متكرر - بمسطح ٢٧٢٥ م٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٠٩٠٠ م٢)



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية

جامعة الجلالة



مبنى كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (أرضي و ٣ متكرر) بمساحة إجمالية ٥١٠٠ م٢



الهيئة العامة للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

جامعة الجلالة



مبنى كلية التمريض (أرضي و ٣ مكرر - بمسطح ٤٦٠٠ م٢ / الدور ومساحة إجمالية ١٨٤٠٠ م٢)



٤٦

جامعة الجلالة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

٢٠١٦/٠٦/١٢



واجهات خارجية

مبنى كلية الطب (أرضي و ٣ متكرر - بمسطح ٥١٠٠ م^٢ / الدور ومساحة إجمالية ٢٠٤٠٠ م^٢)

جامعة الجلالة
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية

٢٠١٩/٠٦/١٢



واجهات خارجية

مبنى كلية الهندسة والعمارة (بدروم وأرضي و ٣ مكرر - بمسطح - ٤٥١ م / الدور ومساحة إجمالية - ٢٢٥٥٠ م^٢)







٦٦


جامعة الجلالة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى




المستشفى الجامعي

٦٧
 جامعة الجلالة
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى

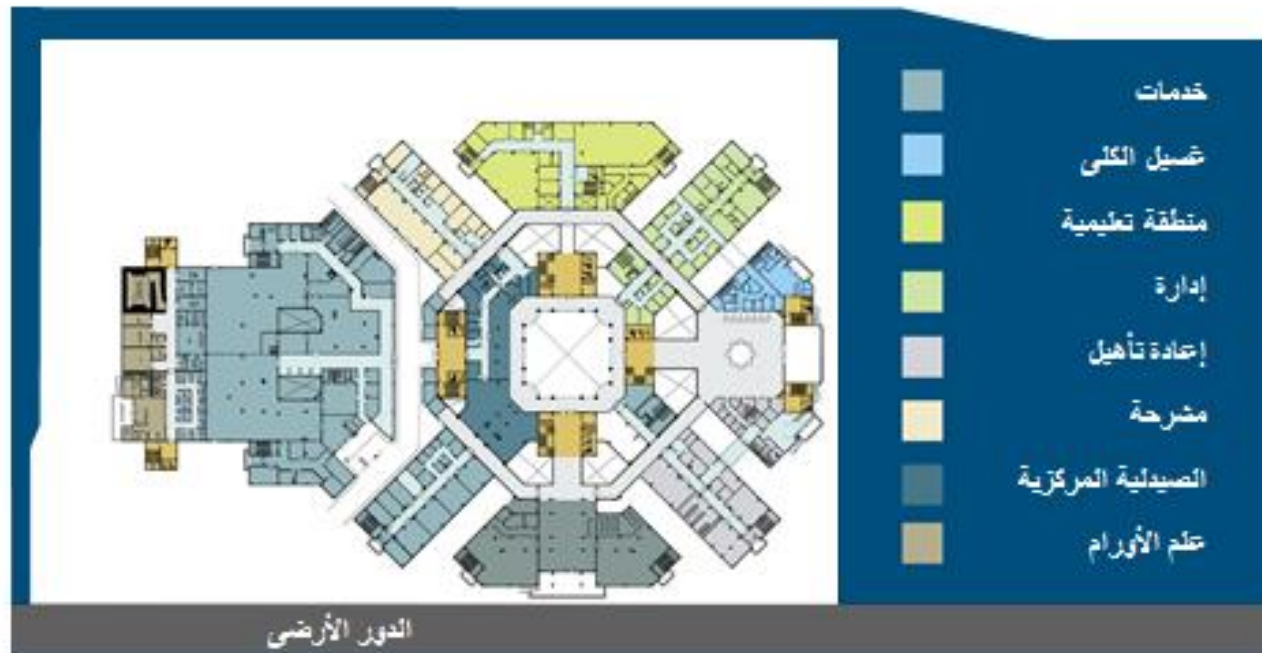

المستشفى الجامعي


٦٨
 جامعة الجلالة
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى

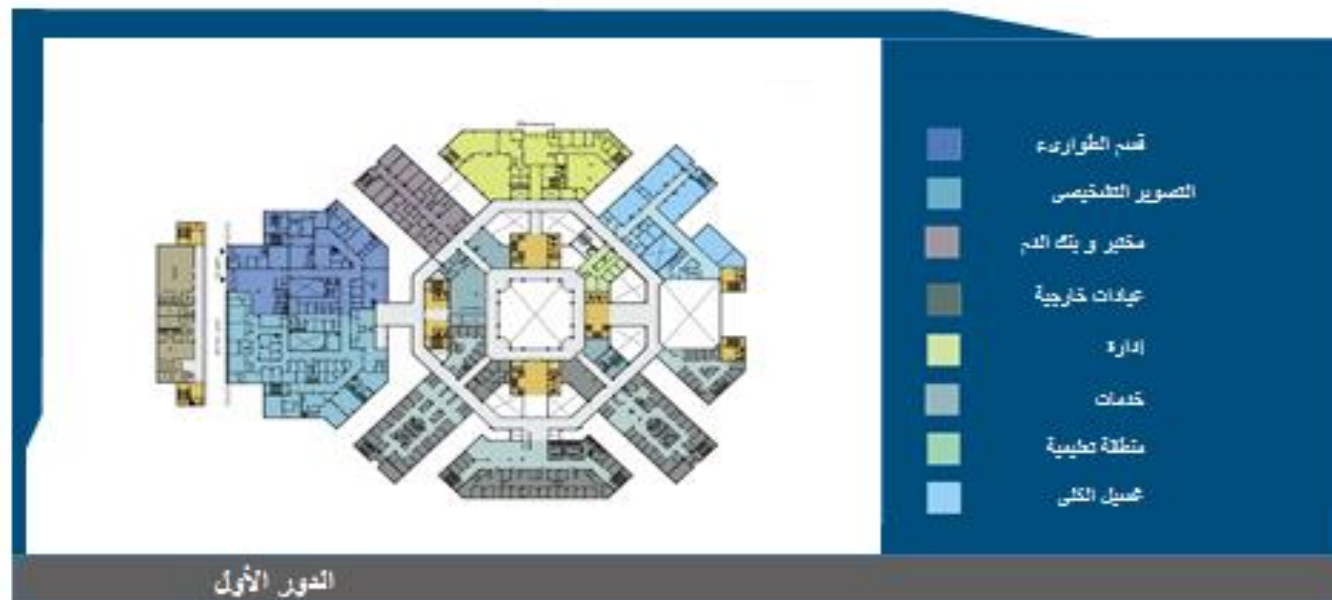

المستشفى الجامعي

جامعة الجلالة
المدينة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الحربية

٦٦

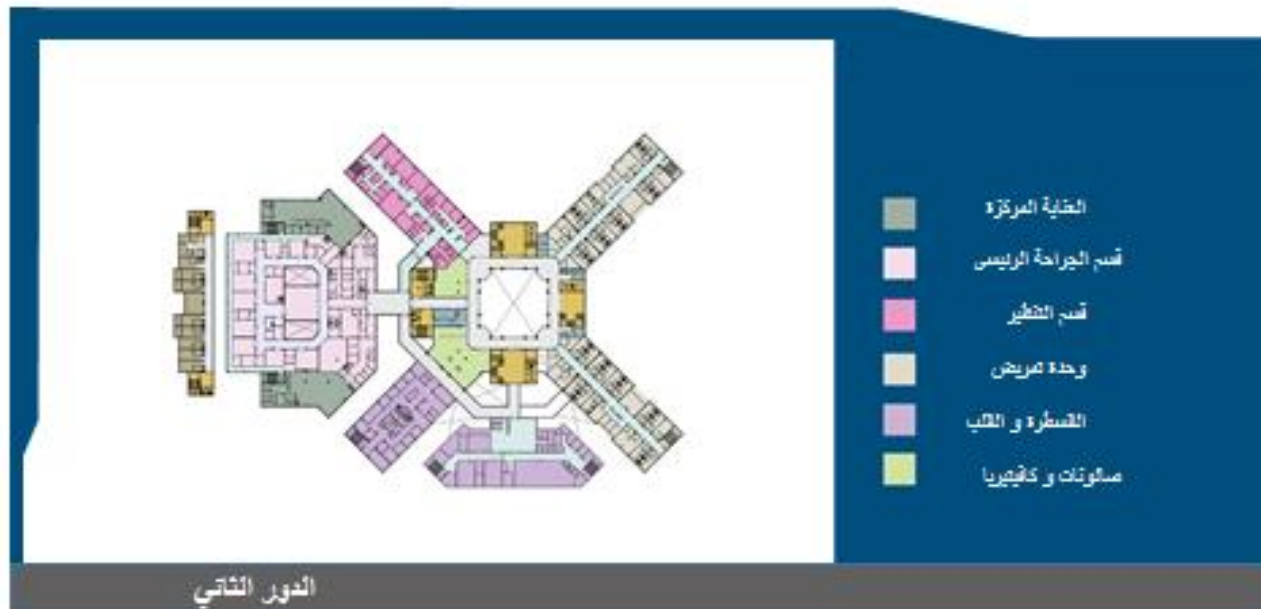


المستشفى الجامعي



٧٠


 جامعة الجلالة

 الهيئة الهندسية للأشغال المسلحة
 لإدارة المشروعات الكبرى

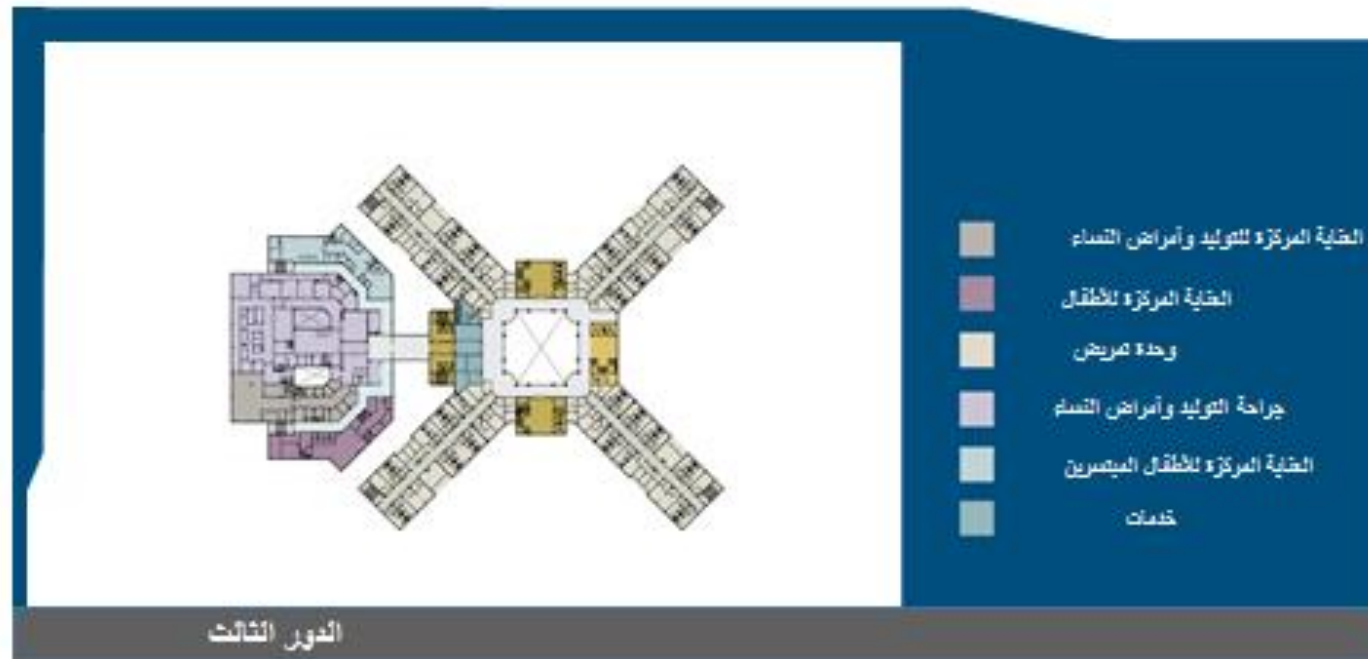

المستشفى الجامعي

VI
 جامعة الجلالة
 الهيئة الهندسية لقنوات الملحة
 إدارة المشروعات الكبرى

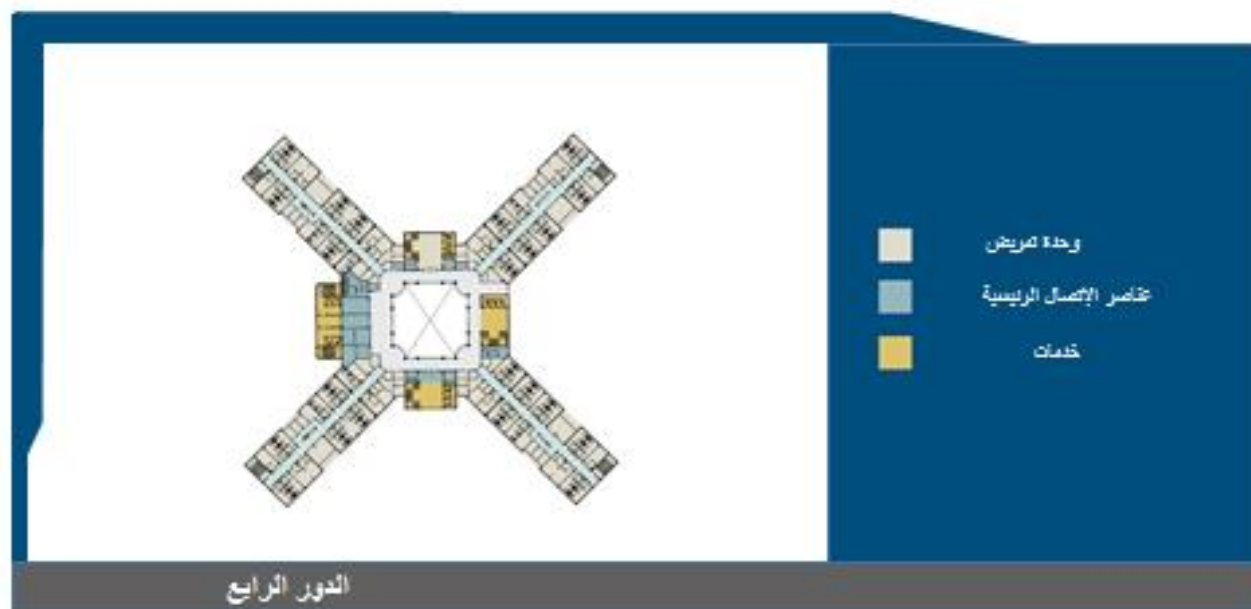


المستشفى الجامعي



إختيار القيادات الجامعية لجامعة الجلالة

تقدم لمنصب رئيس الجامعة ٥٧ متقدم موزعين طبقا للعناصر المختلفة
كالتالي:



- تم تحديد الشروط لكل وظيفة بالجامعة
- تم الاعلان وقبول الطلبات عبر موقع إلكتروني
- تقدم حوالي ١٧٢ الشغل المناصب القيادية بالجامعة

التوزيع طبقا لدولة الحصول على درجة الدكتوراه

جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

الهيئة العامة للتعليم العالي
إدارة المشروعات الكبرى

جامعة الملك سلمان جنوب سيناء



منظور الجامعة بمدينة الطور

وزارة التعليم العالي			الجهة المستفيدة
٣٠٠ مليون دولار + ١٩٨٩ مليون جنيه ٢٥٠ مليون دولار إنشاعات + ٥٠ مليون دولار فرش			القيمة التقديرية (مرحلة الأولى)
٣٠٠ مليون دولار			المخصص المالي
(٧,٥ + ٢٥٠) مليون دولار			الموارد
٢٠١٧ / ٦ / ١٥			تاريخ بدء المشروع
رأس سدر	الطور	شرم الشيخ	تاريخ التهور المخطط
٢٠٢٠ / ٣ / ٣٠		الأسبقية الأولى : ٢٠١٩ / ٧ / ١٥ الموقع العام : ٢٠١٩ / ٨ / ٣٠ الأسبقية الثانية : ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١	
٩٩ %	٧٠ %	٧٣ %	
			تسمية للتنفيذ

المكونات
الرئيسية
للمشروع



- المرحلة الأولى :** تضم عدد (٨) كلية (٧ كلية + كلية تم اضافتها خارج المخصص المالي) بعدد (٣) مدن ثلاثية :
- عدد (٣) كلية بمدينة الطور - القصر الرئيسي للجامعة (الهندسة - العلوم - الصناعات التكنولوجية) بالإضافة إلى (مبنى الإدارة - سكن الطلبة والطالبات ٢٠ مبنى - سكن الأساتذة ٥ مبنى - سكن رئيس الجامعة ٢ مبنى - مكتبة مركزية - قاعة مؤتمرات - مسجد - منشآت رياضية - ملاعب - مباني خدمية)
 - عدد (٣) كلية بمدينة شرم الشيخ (الألسن واللغات التطبيقية - السياحة والضيافة - العمارة) بالإضافة إلى (سكن الطلبة والطالبات ٩ مبنى - سكن الأساتذة ١ مبنى - مكتبة - منشآت رياضية - مسجد - فندق تعليمي - مبنى الإدارة - مباني خدمية)
 - عدد (٢) كلية بمدينة رأس سدر (الزراعات الصحراوية - العلوم الإدارية) بالإضافة إلى (سكن الطلبة والطالبات ٨ مبنى - سكن الأساتذة ١ مبنى - مسجد - مكتبة - ملاعب - منشآت رياضية - مباني مساعدة لكلية الزراعة - مبنى الإدارة - مباني خدمية)
- المرحلة الثانية :** تضم عدد (٤) كلية + مستشفى جامعي ثلاثي :
- عدد (٣) كلية بمدينة الطور (كلية الصيدلة - كلية الطب - كلية التمريض) بالإضافة إلى المستشفى الجامعي
 - عدد (١) كلية بمدينة رأس سدر (كلية علوم المجتمع)

الموقف التنفيذي لأعمال الشبكات والموقع العام والفرش والتجهيزات

م	الموقع	البيان	نسبة التقية	ملاحظات
١	الطور	شبكة الصرف الصحي	١٥ %	(١) تم التنسيق بين البيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نحو توصيل المرافق حتى مواقع الجامعة الثلاثة وسيتم مواءمته في خلال أسبوع من تاريخه بتاريخ التمهيد المنتظر .
		شبكة التقية بالمياه	١٥ %	
		شبكة الكهرباء	٢٠ %	
		الطرق والموقع العام	٢٠ %	
٢	شرم الشيخ	شبكة الصرف الصحي	٧٠ %	(٢) جرى تقييد شبكة الكهرباء الخارجية للربط على مواقع الجامعة الثلاثة بواسطة شركة الكهرباء .
		شبكة التقية بالمياه	٣٠ %	
		شبكة الكهرباء	٣٥ %	
		الطرق والموقع العام	٢٥ %	
٣	راس سدر	شبكة الصرف الصحي	١٥ %	(٤) تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي على موافقة يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩ بجدول زمني لاستلام اللوحات المطلوبة للتجهيزات والتشطيبات الخاصة بالمعامل
		شبكة التقية بالمياه	٢٠ %	
		شبكة الكهرباء	١٥ %	
		الطرق والموقع العام	١٠ %	



جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز

الهيئة العامة للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

التوقيعات المنتظرة لنهـو الأعمال بالمشروع

تم دراسة التوقيعات المنتظرة لنهـو الأعمال بأقرع الجامعة الثلاثة (الطور- شرم الشيخ - رأس سفر) و قد خلصت الدراسة للآتي :

أولاً : أقرع شرم الشيخ :


1. نهـو (مبانى ادارة الجامعة- مبانى كليتي (الساحة و الضيافة - كلية العمارة) - الفندق التعليمى - مبانى سكن الطلبة و الطالبات - مبانى سكن أعضاء هيئة التدريس - أعمال الشبكات وتنسيق الموقع العام - الأسوار و البوابات) بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ .
2. نهـو (مبانى كلية الألسن و اللغات- الحفظ الدائرة بواجهة أقرع الجامعة) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ .

ثانياً: أقرع رأس سفر :

1. نهـو (مبانى كلية الزراعة - مبانى ادارة الجامعة - مبانى الخدمات) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
2. نهـو (مبانى كلية العلوم المالية و الادارية - مبانى المكتبة - أعمال الشبكات- تنسيق الموقع العام - الأسوار و البوابات) بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠ .

ثالثاً : أقرع الطور :

1. نهـو (مبانى كلية الهندسة - مبانى ادارة الجامعة - الصالة الرياضية - المكتبة المركزية- المسجد- مبانى سكن الطلبة و الطالبات - مبانى سكن أعضاء هيئة التدريس - أعمال الشبكات) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
2. نهـو (مبانى كلية العلوم - مبانى كلية الصناعات التكنولوجية - قاعة المؤتمرات - الطرق وتنسيق الموقع العام - الأسوار و البوابات) بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ .



جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز

الهيئة العامة للأغذية والأدوية
إدارة المشروعات الكبرى

الطاقة الإستيعابية للجامعة

م	الموقع		الكلية	العدد المقترح بالسنة الدراسية	عدد الطلاب	
١	مرحلة أولى	الطور	كلية الهندسة	٥x٥٠٠	٥,٧٠٠	
٢			كلية العلوم	٤x٤٠٠		
٣			كلية الصناعات التكنولوجية	٤x٤٠٠		
٤	مرحلة ثانية		كلية الطب	٣x٥٠٠ (٢x٢٥٠ امتياز)	٤,٨٠٠	
٥			كلية التمريض	٤x٢٠٠		
٦			كلية الصيدلة	٥x٤٠٠		
٧	مرحلة ثالثة		كلية الحاسبات والمعلومات	جارى التنسيق مع اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي		
٨	مرحلة أولى	شرم الشيخ	كلية الآمن واللغات التطبيقية	٤x٤٠٠	٣,٥٠٠	
٩			كلية السياحة والضيافة	٤x٤٠٠		
١٠			كلية العمارة	٥x٩٠		
١١	مرحلة ثالثة			كلية الفنون	جارى التنسيق مع اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي	
١٢			كلية الإعلام	جارى التنسيق مع اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي		
١٣	مرحلة أولى	رامن سدر	كلية العلوم والإدارية	٤x٤٠٠	٣,٢٠٠	
١٤			كلية الزراعات الصحراوية	٤x٤٠٠		
١٥			كلية علوم المجتمع	٤x٤٠٠	١,٩٠٠	
١٦	مرحلة ثالثة			كلية طب بيطري		جارى التنسيق مع اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي
الإجمالي (المرحلة الأولى ١٢,٤٠٠ طالب – المرحلة الثانية ٩,٤٠٠ طالب)					١٨,٨٠٠ طالب	

جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء شرم الشيخ
(نسبة التنفيذ ٧٣ %)



جامعة الملك سلمان يجتوب سيناء (مدينة شرم الشيخ)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدامة المشروعات الكبرى



المساحة الاجمالية للموقع : ٢٥ فدان
 تقريباً (١٠٥,٠٠٠ م^٢)

المساحة البنائية الكلية : ٢٥,٩٥٠ م^٢
 مساحة الدور الأرضي : ٢٥,٢٩٠ م^٢
 إجمالي المساحات المفتوحة : ٩,٠٠٠ م^٢
 النسبة البنائية : ٢٥ %

الموقع العام للجامعة بمدينة شرم الشيخ





الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية



المسجد الكبير، القاهرة

والجدير بالذكر ان اللجنة الاقتصادية اقترحت ان يكون

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

وتم إنشاء كلية الهندسة والمعماريات وذلك استجابة لعدد من الجامعات العراقية التي قد قاموا بانشاء
الكلية المعمورة وذلك في جامعة الكوفة التي انشأتها بصورة خاصة.

doi:10.1016/j.jmb.2005.07.005

تتمتع كلية العلوم البيئية بمرافق علمية حديثة ومتطورة، حيث تتوفر فيها أحدث الأجهزة والمعدات العلمية، بالإضافة إلى وجود مختبرات متخصصة في مجالات البيئية المختلفة، مما يتيح للطلاب فرصة التعلم العملي والتطبيق.

١٩٨٥: ١٠٠) في السنة الإسلامية الأولى، غريم التمدد

[illegible]

و.م. العظمى، عمان

والله اعلم

— 114 —

Journal of Management Education 34(1)

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

كتاب وزارة التعليم العالي رقم (١٣٥٠) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨

إستغلال مساحة (١٠) قدان لصالح كلية القنون وكلية الإعلام طبقاً لكتاب وزارة التعليم العالي رقم (١٣٥٠) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الحكرى

جامعة الملك سلمان يجنوب سيناء (مدينة شرم الشيخ)

مكونات الموقع العام

- ١ - كلية السياحة والضيافة
- ٢ - كلية الآلسن و اللغات التطبيقية
- ٣ - كلية العمارة
- ٤ - مبنى الإدارة
- ٥ - فندق تعليمى
- ٦ - سكن أعضاء هيئة التدريس ١ مبنى
- ٧ - سكن الطلاب / الطائيات ٦ مبنى
- ٨ - المكتبة المركزية
- ٩ - الملاعب
- ١٠ - المسجد



الموقع العام للجامعة بمدينة شرم الشيخ



جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء (مدينة شرم الشيخ)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الحكرى



متطور الموقع العام للجامعة بمدينة شرم الشيخ



١٣



جامعة الملك سلمان يجتوب سيناء (مدينة شرم الشيخ)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

٢٠١٧ / ٠٦ / ١٦



٢٠١٦ / ٠٤ / ٢٠



مبنى الإدارة (أرضي + ٢ دور) بإجمالي مساحة ٣٩٨٥ م^٢



١٥

جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز (مدينة شرم الشيخ)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية



مبنى الإدارة (أرضي + ٢ دور) بإجمالي مساحة ٣٩٨٥ م^٢



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية

جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز (مدينة شرم الشيخ)



مبنى كلية السياحة (أرضي + ٢ دور) بإجمالي مساحة ١١٤٠٠ م^٢





جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز (مدينة شرم الشيخ)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية

٢٠١٧ / ٠٦ / ١٦



الواجهات الخارجية

مباني سكن الطلبة / الطالبات (عدد ٦ مبنى أرضي + ٣ دور مكرر) بإجمالي مساحة ٢٣٤٠ م٢ / المبنى



جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء (مدينة الطور)

الهيئة الهندسية للأغوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية



المساحة الاجمالية للموقع: ٢٠٥ فدان
تقريباً (٨٩١.٠٠٠) ٢٥

المرحلة الأولى:

المساحة: ١٣٤ فدان تقريباً (٥٩٢.٨٠٠) ٢٥
إجمالي المساحة البنائية: (١٧٩.٠٠٠) ٢٥
مساحة الدور الأرضي: (٧٢.٥٠٠) ٢٥
النسبة البنائية: ١٢.٨ %

المرحلة الثانية:

المساحة: ٣٧ فدان تقريباً (١٥٥.٤٠٠) ٢٥

امتداد مستقبلي:

المساحة: ٣٤ فدان تقريباً (١٤٢.٨٠٠) ٢٥

الموقع العام للجامعة بمدينة الطور



الهيئة العامة لشؤون الزراعة
 إدارة المشروعات الكبرى

جامعة الملك سلمان جنوب سيناء (مدينة الطور)



كتاب محافظة جنوب سيناء رقم (١٢١٣٩) بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨

تخصيص مساحة (١٥٠) فدان إضافية لموقع الجامعة بالطور طبقاً لكتاب محافظة جنوب سيناء
 رقم (١٢١٣٩) بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨



جامعة الملك سلمان جنوب سيناء (مدينة الطور)

**الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى**



كتاب وزارة التعليم العالي رقم (١٣٥٠) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨

إستغلال مساحة (١٥٠) قدان لصالح كلية الحاسبات والمعلومات وذلك لإستضافة عدد من الحضانات التكنولوجية طبقاً لكتاب وزارة التعليم العالي رقم (١٣٥٠) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشتريات العسكرية

مرحلة أولى:

- ### ١ - معنى الإشارة

- ### ١- مبنى الإدارة

- ٢ - كلية الصناعات التكنولوجية

- ### ٣- كلية الهندسة

- ٤ - كلية العلوم

- ## ٥ - القصول والخدمات التعليمية

- ٩ - المحتشيه المرقية

- ٧ - المسجد

- ٨ - شاعره من امرات

- ١٠ - تمديد المصطفیٰ رضی اللہ عنہ

- ١٠ - منطقة الملاح

- ١٢- من: الأستاذة (هـ منير)

- + فِئَلَاتٍ، نَفْسٍ وَنَفِيسٍ، نَفْسٍ

- ۱۳ - انظر سطور

- من حلة ثالثة

٦٤ - طائفة نصيرية

- ١٥ - طلبة تصدقوا

- ١٩ - كلية الطب

- ١٧ - استيفاء

- 100



محل

مدخل قرعي


المذقل الرئيسي

الى شرم الشيخ

مدخل قرعی

جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء رأس سدر
(نسبة التنفيذ ٦٩ %)

الهيئة العامة للأوقاف المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء (مدينة رأس سدر)

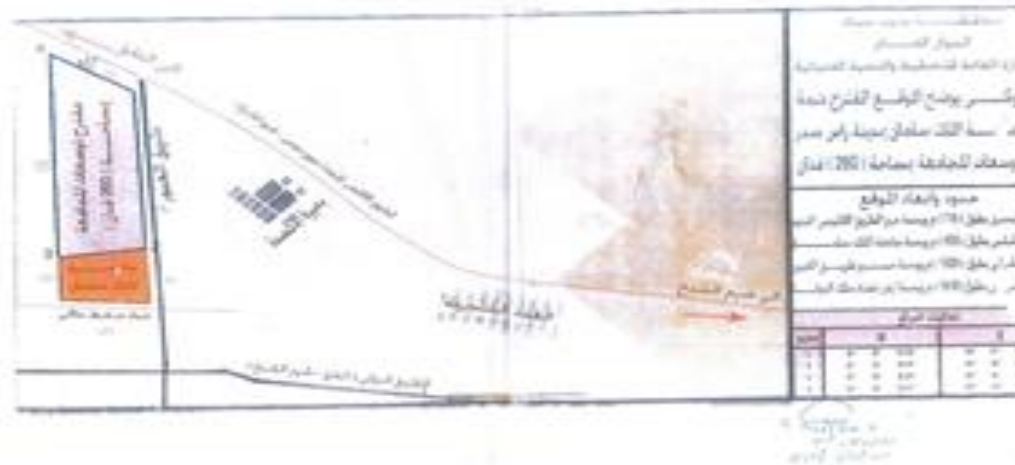

المملكة العربية السعودية
 محافظة جنوب سيناء
 مكتب الوزير

الخريطة التوضيحية لموقع المشروع

الموقع المخطط له للمشروع

الحدود والارتفاعات المخطط لها

الخريطة التوضيحية لموقع المشروع

الموقع المخطط له للمشروع

الحدود والارتفاعات المخطط لها

الخريطة التوضيحية لموقع المشروع

الموقع المخطط له للمشروع

الحدود والارتفاعات المخطط لها

كتاب محافظة جنوب سيناء رقم (١٢١٣٩) بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨

تخصيص مساحة (٢٦٠) فدان إضافية لموقع الجامعة برأس سدر طبقاً لكتاب محافظة جنوب سيناء رقم (١٢١٣٩) بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨





مكتب الوزير



جامعة الملك سلمان يجتوب سيقاء (مدينة رأس سدر)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية



المسجد الكبير، القاهرة

والله اعلم بالصواب

[illegible][illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

هذه وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الإدارية العليا في جمهورية مصر العربية، وتحتوي على الأحكام والقرارات المتعلقة بـ [موضوع الوثيقة].

وكان التنظيم الحالي

والله اعلم بالصواب

— 152 —

Journal of Management Education 34(1)

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 1-10.
 2. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 11-20.
 3. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 21-30.

Source: *Investment* 1993, 2000.

Source: <http://www.fishbase.org>

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 1-10.
 2. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 11-20.
 3. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 21-30.

كتاب وزارة التعليم العالي رقم (١٣٥٠) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨

إستغلال مساحة (٢٦٠) فدان لصالح كلية الطب البيطري ومزرعة للحيوانات وزيادة مساحة مزرعة كلية الزراعات الصحراوية طبقاً لكتاب وزارة التعليم العالي رقم (١٣٥٠) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨





جامعة الملك سلمان جنوب سيناء (مدينة رأس سدر)

الحيطة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى


مكونات الموقع العام

مرحلة أولى:

- ١- مبنى الإدارة
- ٢- كلية العلوم الإدارية
- ٣- كلية الزراعة الصحراوية
- ٤- معامل كلية الزراعة الصحراوية
- ٥- مبنى القصور التعليمية
- ٦- المسجد - المكتبة
- ٧- قاعة محاضرات
- ٨- سكن الطلبة والطالبات (٨ مبنى)
- ٩- مبنى الخدمات التعليمية
- ١٠- ملاعب
- ١١- مبنى سكن الأساتذة
- ١٢- مبنى معامل وقصور

مرحلة ثانية:

- ١٣- كلية علوم المجتمع

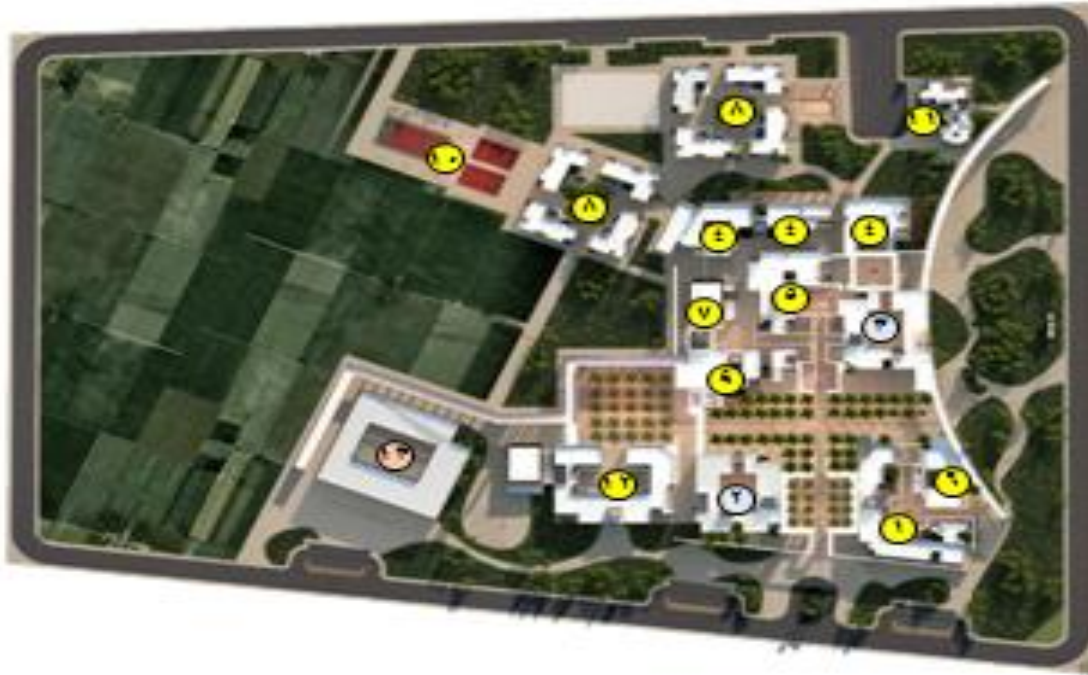

الموقع العام للجامعة بمدينة رأس سدر



جامعة الملك سلمان يجتوب سيقاء (مدينة رأس سدر)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية



مبنى الإدارة والمكتبة (أرضي + ٢ دور) بإجمالي مساحة ١٥٠٠٠ م^٢



م	البيان	الأجراء المتخذ بواسطة الهيئة الهندسية ق . م (إدارة المشروعات الكبرى)
١	توقيعات نهوا/ بدء تسليم أعمال الجامعة	تلتزم إدارة المشروعات الكبرى بنهوا أعمال جامعة الملك سلمان (رأس سدر - الطور - شرم الشيخ) إختياراً من ٣٠ / ٤ / ١٠١٩ وحتى ١ / ٩ / ٢٠١٩
٢	ضم مستشفى الطور العسكري لمتنشات المشروع لإستقلالها كمستشفى تعليمي للجامعة	جارى أعمال التصميمات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
٣	تنفيذ مشروع جامعة الملك سلمان كمرحلة واحدة	جارى أعمال التصميمات الابتدائية لعدد (٤) كلية بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
٤	الشيكات الخارجية	- تم مخاطبة الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالقيمة المالية. - قامت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بمخاطبة مجلس الوزراء بالقيمة المالية لمخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ الشيكات الخارجية.



م	البيان	الاجراء المتخذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المشروعات الكبرى)
٥	الأسوار المطلوب تنفيذها حول قطع الأراضي المقترح ضمها كتوسعات مستقبلية. (١٥٠ قدان بالطور - ٢٦٠ قدان برأس سدر - ١٠ قدان بشرم الشيخ)	- أجمالي أطوال الأسوار المطلوب تنفيذها ١٠,٨ كم طولى - القيمة التقديرية للتنفيذ ٦٥ مليون جنيه. (طبقاً لقائمة أسعار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمحافظة جنوب سيناء)
٦	أعمال / مسئوليات القرش المكتبي / المعمل	مهام إدارة المشروعات الكبرى بشأن أعمال القرش (المكتبي / المعمل) : • <u>تجهيزات متقولات و أثاث :</u> كرسي / سرير / دولاب / قوتيه / كومود / تراييزة . • <u>تجهيزات ثابتة بالقاعات الدراسية / المعامل :</u> بنشآت / سيورات / دواليب حائطية / تراييزات معامل / وصلات الأجهزة (صرق - تغذية كهرباء) . • <u>كافة الأجهزة / العدد / الآلات / المعدات</u> (خارج نطاق مسئولية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)




م	التمني	الشركات المتقدمة
١	مبنى الإدارة (فرع شرم الشيخ) - مبنى فصول كلية الزراعة الصحراوية - سكن الطلبة والطالبات (فرع رأس سدر)	ماريونك
٢	مبنى كلية السياحة - كلية الأمن - مبنى المكتبة الفندق التعليمي - (سكن الطلبة /الطليات - مبنى الأستاذة) (فرع شرم الشيخ)	الجمعية التعاونية للإنشآت بالمعجزة
٣	مبنى إدارة الجامعة (فرع الطور) - مبنى إدارة كلية الهندسة - مبنى فصول كلية الهندسة - مبنى معامل كلية الهندسة - مبنى إدارة كلية العلوم - مبنى فصول كلية العلوم - مبنى المكتبة المركزية - مبنى الصالة الرياضية - المسجد	سيدك
٤	مبنى إدارة كلية الصناعات التكنولوجية - مبنى فصول كلية الصناعات التكنولوجية - مبنى معامل كلية الصناعات التكنولوجية - (سكن الطلاب / الطالبات - سكن الأستاذة) (فرع الطور)	ايونكو
٥	مبنى الإدارة والمكتبة (فرع رأس سدر)	طبية للهندسة
٦	مبنى كلية العلوم الإدارية	مكتب التقوى للمقاولات
٧	مبنى معامل كلية الزراعة الصحراوية	دياجرام
٨	سكن الطلبة والطالبات - مبنى الأستاذة (فرع رأس سدر)	القمامي للمقاولات العامة

مشروع مصر القومي للنهضة العلمية
(مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)



مشروع مصر القومي للتنهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى

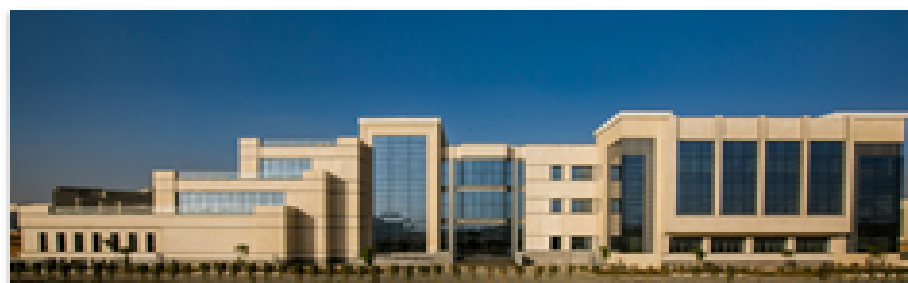

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا		الجهة المستفيدة
المرحلة الثانية	المرحلة الأولى	المراحل
٣.٢ مليار جنيه	٥٥٩ مليون جنيه	القيمة التقديرية
١٣٤٠ مليون جنيه منهم ٤٠٠ مليون ق.م		الموارة
٢٠١٥ / ١٠ / ٣٠	٢٠١٤ / ١٠ / ٢٧	تاريخ بدء المشروع
٢٠٢٠ / ٤ / ٢٥	تم التهور والتسليم	تاريخ التهور
٩٥ %	١٠٠ %	نسبة التنفيذ

المشروع على مسطح ٢٠٠ فدان ومقسم إلى ثلاثة مراحل :

المرحلة الأولى :

- ١ - معهد علوم التاني تكنولوجيا
- ٢ - معهد حلمي للعلوم الطبية
- ٣ - مبنى منطقة خدمات (مبنى الطاقة - غرفة المولدات الكهربائية - الخدمات الهندسية - غرفة المحولات الكهربائية - خزان وقود)
- ٤ - نفق الخدمة - شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى - الأسوار والبيوتات

المرحلة الثانية :

- ١ - مبنى الإدارة التعليمية و٢ معهد (معهد العلوم السياسية - معهد طلعت حرب للاقتصاد والشنون العامة)
- ٢ - مبنى الجامعة
- ٣ - إسكان الطلبة (١٠٣٧ غرفة فندقية) (تم تهور وتسليم قاصد ٨ و ٩ من المبنى بإجمالي ١٤٢ غرفة فندقية)
- ٤ - مبنى شنون الطلبة (تم التهور والتسليم)
- ٥ - شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية (إجمالي مسطح المناطق الخضراء ٦٠ فدان)

المتطلبات
 الرئيسية
 للمشروع

مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الحربية

الموقف المالي للمشروع

إجمالي قيمة المشروع ٢.٤ مليار جنيه (عدد ٣ بروتوكول بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) كالآتي:

- ١ - تم توقيع بروتوكول لتنفيذ المرحلة الأولى بقيمة ٩٩٦ مليون جنيه
- ٢ - تم توقيع بروتوكول مكمل لتنفيذ المرحلة الثانية بقيمة ١,٤٠٤ مليار جنيه
- ٣ - تم توقيع بروتوكول مكمل لتنفيذ استكمال المرحلة الثانية بقيمة ١,٨ مليار جنيه

- إجمالي الوارد للمشروع مبلغ ١٣٤٠ مليون جنيه كالآتي :
- ٤٠٠ مليون جنيه تمويل القوات المسلحة (٢٠٠ مليون تصديق أمارة + ٢٠٠ مليون سلفة من هـ ش مالية)
 - ٦٣٥ مليون جنيه تمويل مدينة زويل
 - ١٩٥ مليون جنيه صندوق تحيا مصر
 - ١١٠ مليون جنيه تبرع من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

إجمالي تعاقدات المشروع مبلغ ٢٧٤٤ مليون جنيه

إجمالي قيمة المتقذ على الطبيعة مبلغ ١٨٤١ مليون جنيه

إجمالي المنصرف ١٢٤٤ مليون جنيه

مشروع مصر القومي للنهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

م	الأسبقية	المبنى	عدد الأدوار	إجمالي مسطح المبنى
١	مرحلة أولى	معهد علوم الفيزياء وتكنولوجيا	يدروم وأرضي وأول وثاني	٢م ٩٧٠٠
٢		معهد علمي للعلوم الطبية	يدروم وأرضي وأول وثاني	٢م ١٢٣٠٠
٣		مبنى الطاقة اليدروم خزان مياه عكره سعة ٥٦٠٠ م ^٣ وخزان مياه التبريد والتكييف سعة ٧٦٠٠ م ^٣	يدروم وأرضي وسطح	٢م ٩١٥٠
٤		مبنى المولدات الكهربائية	أرضي	٢م ٩٩٠
٥		مبنى الخدمات الهندسية	يدروم وأرضي وأول	٢م ٧٤٥٠
٦		غرفة المحولات الكهربائية	أرضي	٢م ١٣٥
٧		خزان وقود سعة ١٣٠٠ م ^٣	تحت الأرض	٢م ١٤٠
٨		أشوار	بطول ٣.٨ كم	
٩		بوابات	٢ بوابة رئيسية و ٤ بوابة فرعية	
١٠		تفقد خدمة بطول ١٨٠٠ متر طولي	تحت الأرض	٢م ٤٩٢٧٠
١١	مرحلة ثانية	مبنى الإدارة التعليمية و٢ معهد (معهد العلوم السياسية - معهد طلعت حرب للاقتصاد والعلوم العامة)	٢ يدروم وأرضي وميزانين وأول وثاني	٢م ٣٨٥٠٠
١٢		مبنى الجامعة	يدروم وأرضي وأول وثاني وثالث	٢م ألف ١١٠
١٣		سكن الطلبة (بإجمالي ١٠٣٧ غرفة فندقية)	يدروم وأرضي و عدد ٥ دور متكرر	٢م ألف ٧٨
١٤		مبنى شئون الطلبة	يدروم وأرضي وأول	٢م ٢٩٠٠
١٥		شبكات رئيسية	مياه / صرف / كهرباء / طرق داخلية	

مشروع مصر القومي للتنهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى



المرحلة الأولى	
١	معهد حتمي للعلوم الطبية
٢	مبنى علوم النانو
٣	مباني الخدمات
٤	٦ بوابات
٥	تفقي الخدمة
المرحلة الثانية	
١	مبنى الإدارة التعليمية و٢ معهد
٢	مبنى الجامعة
٣	سكن الطلاب
٤	شئون الطلاب
المرحلة الثالثة	
١	مباني البحث العلمي
٢	النادي الاجتماعي
٣	المنطقة الرياضية
٤	الهرم التكنولوجي
٥	اسكان أعضاء التدريس
٦	المبنى الأكاديمي
٧	مركز المؤتمرات
٨	معرض العلوم و التكنولوجيا



مشروع مصر القومي للنهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية

المرحلة الأولى

معهد علوم التانو تكنولوجيا	١
معهد حلمي للعلوم الطبية	٢
مياني متطقة خدمات (مياني الطاقة - مياني المولدات الكهربائية - الخدمات الهندسية - غرفة المحولات الكهربائية - خزان وقود)	٣
تفق الخدمة - شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى - الأسوار والبوابات	٤

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى
 مشروع مصر القومي للتنهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

معهد علوم التانو تكتولوجي

٢٣ ٣٢٠٠

دور الينروم

٢٣ ٢٩٠٠

الدور الأرضي

٢٣ ٢١٠٠

الدور الأول

٢٣ ١٨٠٠

الدور الثاني

عدد (٤) دور

إجمالي مساحة ٩٧٠٠ م٢



المرحلة
الأولى

المبني يضم : ٢٧ (فصل / معمل / قاعة دراسية) + منطقة تخصصية لأبحاث التانو (المنطقة النظيفة) تتطلب تحشم في الضغط وجزئيات الهواء
 السجوة بها أثناء الإختبارات وهي تضم ٢٨ فراغ منهم ٩ فراغات للتجارب



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إداره المشروعات الكبرى

مشروع مصر القومي للنهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا



معهد علوم التاتو تكنولوجي

٢٥ ٣٢٠٠	دور البندوب
٢٥ ٢٩٠٠	الدور الأرضي
٢٥ ٢١٠٠	الدور الأول
٢٥ ١٨٠٠	الدور الثاني

عدد (٤) دور
 بإجمالي مساحة ٩٧٠٠ م٢



المرحلة
 الأولى

المبنى يضم : ٢٧ (فصل / معمل / قاعة دراسية) + منطقة تخصصية لأبحاث النانو (المنطقة النظيفة) تتطلب تحميد في الضغط وجزيئات الهواء
 الموجودة بها أثناء الاختبارات وهي تضم ٢٨ فراغ منهم ٩ فراغات للتجارب



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارية المشروعات الكبرى
 مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

معهد حلمي للعلوم الطبية

٢٥ ٣٧٧٥

دور البعوض

٢٥ ٣٢٠٠

الدور الأرضي

٢٥ ٣٣٢٥

الدور الأول

٢٥ ٢٠٠٠

الدور الثاني

تعدد (٤) دور

إجمالي مساحة - ١٢٣٠٠ م٢



المرحلة
الأولى

المبنى يضم: ٥٩ (فصل / معمل / قاعة دراسية) + منطقة تخصصية (بيت الحيوان) مخصصة لتجهيز الحيوانات التي يجرى عليها التجارب الطبية
 تضم ٢٨ غرفة تشف / معيشة / عزل



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى
 مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

مبنى الخدمات الهندسية

٢٥ ٢٥٧٥

دور القروم

٢٥ ٢٥٧٥

الدور الأرضي

٢٥ ٢٣٠٠

الدور الأول

تعدد (٣) دور

بإجمالي مساحة ٧٤٥٠ م٢



المرحلة
الأولى

المبنى يضم مجموعة مختبرات - مناقب إدارية - ١٠ ورش - غرفة سمينار



 مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 لإدارة المشروعات الكبرى

مبنى الطاقة

٣٠٥٠ م٢

دور اليدروم

٣٠٥٠ م٢

الدور الأرضي

٣٠٥٠ م٢

الدور الأول

عدد (٣) دور


بإجمالي مساحة ٩١٥٠ م٢



المرحلة
 الأولى

المبنى يضم دور اليدروم خزان مياه حريق وتكييف سعة ٧٦٠٠ م٣ وخزان مياه تكره سعة ٥٦٠٠ م٣
 والدور الأرضي معدات التكييف والدور الأول أبراج التبريد





مشروع مصر القومي للنهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة العامة للأقوات المساحة
إدارة المشروعات الكبرى

المرحلة الثانية

١ مبنى الإدارة التعليمية و٢ معهد (معهد العلوم السياسية - معهد طلعت حرب للاقتصاد والشنون العامة)

٢ مبنى الجامعة

٣ إسكان الطلبة (٣٧ - ١ غرفة فندقية)

٤ مبنى شنون الطلبة

٥ شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية

مبنى الإدارة التعليمية

الهيئة العامة للأقوات المساحة
 إدارة المشروعات الكبرى
 مشروع مصر القومي للنهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

مبنى الإدارة التعليمية و ٢ معهد تعليمي
 معهد العلوم السياسية و معهد طلعت حرب للاقتصاد والشنون العامة

٢م ٥٠٠	دور الميزانين	٢م ١٣٣٠٠	دور اليدروم ١
٢م ٧٦٥٠٠	الدور الاول	٢م ٧٦٠٠	دور اليدروم ٢
٢م ٢٨٠٠	الدور الثاني	٢م ٧١٠٠	الدور الأرضي

عدد (٦) دور
 بإجمالي مساحة
 ٢م ٣٨٥٠٠



المرحلة
 الثانية

م	الاحتمال	نسبة التغطية
١	الإحتيادية	٧١ %
٢	الميكانيكية	٥٢ %
٣	الصحية	١٥ %
٤	الكهربائية	٢٠ %
	الإجمالي	٦٥ %

 مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

مرحلة ثانية

مبنى شئون الطلبة

يدروم وأرضي وأول





مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

٦ دور

مبنى الإدارة التعليمية و٢ معهد تعليمي

مرحلة ثانية



مبنى الجامعة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 لإدارة المشروعات الكبرى
 مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

مبنى الجامعة

٢٠١٦٥٧٠	الدور الثاني	٢٠١٦٥٧٠	دور البندوب
٢٠١٦٥٧٠	الدور الثالث	٢٠١٦٥٧٠	الدور الأرضي
		٢٠١٦٥٧٠	الدور الأول

عدد (٥) دور
 بإجمالي مساحة
 ١١٠ ألف م^٢



المرحلة
 الثانية

م	الاحتمال	نسبة التقية
١	الإحتيادية	٧١ %
٢	الميكانيكية	١٠ %
٣	الصحية	٥ %
٤	الكهربائية	١٠ %
	الإجمالي	٣٥ %

مشروع مصر القومي للتنهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

يدروم وأرضي وأول وثاني وثالث

ميتى الجامعة

مرحلة ثانية



 مشروع مصر القومي للتنهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إداره المشروعات الكبرى

مبنى سكن الطلبة (ألف غرفة فندقية)

٢٠ ١١١٤٥

دور البدرج

٢٠ ١١١٤٥

الدور الأرضي

الدور ١١١٤٥ ٢٠

عدد ٥ دور متكرر

عدد (٧) دور

بإجمالي مساحة ٧٨ ألف م^٢



المرحلة
 الثانية



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الحكرى

مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا



يدروم وأرضى و ٥ متكرر

سكن الطلبة

مرحلة ثانية

عينة فرش الغرف الفندقية



مبنى شئون الطلبة

الهيئة الهندسية للأغوات المساحة
إدارة المشروعات الكبرى

مشروع مصر القومي للتنهضة العلمية
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

مبنى شئون الطلبة

٢٠٨٧٠ م

دور اليدروم

٢٠٨٧٠ م

الدور الأرضي

٢٠٨٦٠ م

أول

عدد (٣) دور

بإجمالي مساحة ٢٦٠٠ م



المرحلة
الثانية



جامعة العلمين

جامعة العلمين الجديدة



جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (مدينة العلمين الجديدة) (10) كلية حاسبات ومعلومات و (11) كلية علوم هندسية 1



نبذة عن المشروع

- المساحة والنسب البنائية:
 - إجمالي المساحة المبنية في جميع مراحل المشروع ٦٠٤٥٢٢ م^٢.
 - مساحة أرض المشروع ١٠٣ فدان (٤٢٩٤١٤ م^٢).
 - النسبة البنائية (٢٠٪).
- مكونات الجامعة:
 - كلية الفنون والتصميم.
 - كلية الدراسات العليا.
 - كلية القانون الدولي.
 - كلية هندسة الحاسبات والمعلومات.
 - كلية العلوم الهندسية ١ .
 - كلية العلوم الهندسية ٢ .
 - كلية السياحة والضيافة .

جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (مدينة العلمين الجديدة) (07) كلية الفنون والتصميم



ملخص عن الأعمال التنفيذية :

بناء على توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة قطاعات، وجاء ملخص أعمال القطاعات الثلاثة كالآتي :

• ملخص أعمال القطاع الأول (شركة ريدكون للتعمير ش.م.م):

١. الأعمال المساحية بالموقع :

- قامت الشركة بعمل الميزانية الشبكية للموقع بالكامل وتقديمها للاعتماد من الجهاز.
- بناء علي طلب الجهاز بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩ تم استلام الميزانية الشبكية للموقع بالكامل من قبلنا .
- تم توقيع الجسات التأكيدية للمباني .
- تم توقيع السور بالموقع .
- تم توقيع مبني كلية القانون الدولي وجاري اعمال الحفر .
- تم توقيع مبني كلية الحاسبات والمعلومات وجاري اعمال الحفر .
- تم الانتهاء من اعمال الجسات التأكيدية للمباني بتاريخ ٢٠١٨/5/1 .
- تم اعتماد عينات سن ورمل المورد بالموقع للاستخدام كترية احلال .

- تم توقيع مبني كلية العلوم الهندسية ٢ وجاري اعمال الحفر.
- ٢. أعمال الأسوار:
 - تم حفر الضلع الشمالي من الموقع.
 - تم توقيع قواعد السور وتم عمل النجارة للقواعد العادية.
- ٣. أعمال الحفر مبني كلية القانون الدولي:
 - جاري استكمال اعمال الحفر للمتبقّي من مسطح المبني.
 - جاري اعمال طبقة ثالثة احلال لجزء من المبني .
 - جاري اعمال طبقة ثانية احلال لجزء من المبني .
- ٤. أعمال الحفر مبني كلية هندسة الحاسبات والمعلومات:
 - جاري اعمال الحفر لكامل مسطح المبني.
- ٥. أعمال الحفر مبني كلية العلوم الهندسية ٢ :
 - اعمال الحفر بمبني العلوم الهندسية ٢.
- ٦. أعمال الحفر مبني كلية السياحة والضيافة :

- **جاري اعمال الحفر بمبني كلية السياحة والضيافة .**
- ٧. **اعمال الحفر لمبني كلية العلوم الهندسية ١ :**
- **جاري اعمال الحفر لمسطح المبني.**
- ٨. **أعمال الجسات التأكيدية:**
- **قامت الشركة بتقديم لوحة أعمال الجسات التأكيدية إلى مكتبنا للاعتماد بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٨ وتمت المراجعة والرد بالموافقة بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨، مع التوجيه بتقديم اللوحة للاعتماد من جهاز مدينة العلمين الجديدة وتم الانتهاء من اعمال الجسات التاكيدية بتاريخ ١/٥/٢٠١٨ .**
- **ملخص أعمال القطاع الثاني (شركة سياك):**
- ١. **الأعمال المساحية للموقع :**
- **تم توقيع وتسليم الجسات التأكيدية للمباني .**
- **تم تسليم الميزانية الشبكية للموقع العام وسيتم استلام ميزانية اجزاء الانفاق .**
- ٢. **أعمال الجسات التأكيدية:**

- قامت الشركة بتقديم لوحة أعمال الجسات التأكيدية للاعتماد بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٧ وتمت المراجعة والرد بالموافقة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٨.
- تم الانتهاء من أعمال الجسات التأكيدية وارسالها للجهاز للاعتماد .
- ٣. أعمال تجهيز الموقع:
 - جاري اعمال تجهيز الموقع .
- ٤. أعمال الحفر بمبني كلية الفنون والتصميم:
 - جاري اعمال الحفر بمبني كلية الفنون والتصميم .
- ٥. أعمال الحفر بمبني كلية الدراسات العليا:
 - جاري اعمال الحفر لمسطح المبني.

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة



جامعة
المنصورة
الجديدة

كلية العلوم

كلية الطب البشرى

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

مستشفى جامعي

كلية إدارة الأعمال

كلية المعاملات القانونية الدولية

كلية علوم وهندسة المنسوجات

كلية الهندسة

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات



الاجراءات التي تمت حتى الان

قامت الوزارة بتضمين خطتها الاستثمارية للخطة متوسطة الأجل ٢٠٢١-٢٠١٨ والعام الأول منها ٢٠١٩/٢٠١٨ احتياجات الوزارة الخاصة بإنشاء جامعة العلمين بمبلغ مليار جنيه منها ٧٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بواقع (٥٠٠ مليون مبانى غير سكنية، ١٢٥ مليون عدد وأدوات ، و ١٢٥ مليون تجهيزات) والباقي في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، وجامعة المنصورة الجديدة بمبلغ مليار جنيه منها مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه بداية من عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والباقي في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ..

جامعة المنصورة الجديدة

صور اعمال القواعد المسلحة



جامعة المنصورة الجديدة

صور لأعمال الحديد والنجارة وصب الأعمدة للسور



إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية (القاهرة الجديدة - بني سويف - قويسنا)

الهيئة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
 إدارة المشروعات الكبرى
 إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية
 (القاهرة الجديدة - بنى سويف - قويسنا)



الجهة المستفيدة	وزارة التعليم العالي
قيمة الاستثمار	٣٩٥ مليون جنيه
الوارد	٢٠٠ مليون جنيه سلفة من هيئة شئون مالية
تاريخ البدء	٢٠١٨ / ٣ / ١٠
الكلية	القاهرة الجديدة
	بنى سويف
تاريخ التمهيد	قويسنا
	إدارة الجامعة الخاصة
نسبة التنفيذ	٢٠١٩ / ١ / ٣٠
	حدا الموقع العام ٢٠١٧ / ٨ / ٣٠
	٨٨ %
	٨٥ %
	٨٥ %
	٩٠ %

- كلية التكنولوجيا بالقاهرة الجديدة :**
 - إشراء مبنى رئاسة الجامعة (بدروم + أرضي + أول + ثاني) على مساحة قدرها (٢٠٣٢) م^٢ ويشمل (إدارة الجامعة - مدرجات الكلية - معمل وفصول دراسية) .
 - إشراء مبنى الإدارة العامة للجامعات الخاصة (بدروم + أرضي + أول + ثاني) على مساحة (١١٥٠) م^٢ - (تم البدء في تنفيذ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨) .
 - رفع كفاءة المبنى القائمة وإستكمال أعمال الموقع العام وتشمل (الطرق والمشيات - خزانات الحريق - الإضاءة - الزراعات)
- كلية التكنولوجيا بقويسنا :**
 - إشراء مبنى تعليمي (أرضي + ٢ دور متكرر) ويشتمل على (قاعات تدريس - معمل - صالات رسم - مكتبة - مكتب إدارية) بمساحة (٣٣٩٤) م^٢ .
 - إشراء مبنى ورش دور أرضي ويشتمل على (٣) ورشة و (٣) مخزن بمساحة (٣١٢) م^٢ .
 - إشراء ٣ ملاعب جديدة ورفع كفاءة الموقع العام وتشمل على (أرضقة - مناطق خضراء - طرق) .
- كلية التكنولوجيا ببنى سويف :**
 - هدم المبنى القديم وإشراء مبنى تعليمي جديد (أرضي + أول + ثاني) ويشتمل على (قاعات تدريس - معمل - مكتب إدارية) بمساحة (٢٢٤٤) م^٢ .
 - إشراء مسجد ١٠٠ مصلى + إشراء عدد (٢) ملعب خراسي .

المكونات الرئيسية للمشروع

كلية التكنولوجيا بالقاهرة الجديدة
نسبة الترقية (٩٠ %)



إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الحربية

مكونات الموقع العام



١ مبنى الورش القائم

٢ مبنى الإدارة العامة للجامعات الخاصة

٣ المبنى التعليمي الإداري الجديد

٤ المبنى الإداري التعليمي القائم

مكونات الموقع العام





إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

المبنى التعليمي الإداري الجديد



متطور مبنى رئاسة الجامعة الجديد بالقاهرة الجديدة (أرضى و ٣ دور)



إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

١٦



الواجهات الخرجية

مبنى رئاسة الجامعة الجديد - أرضى و ٣ دور



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

مبنى الإدارة العامة للجامعات الخاصة بالقاهرة الجديدة



مبنى الإدارة العامة للجامعات الخاصة

كلية التكنولوجيا بقويسنا

نسبة التنفيذ (٨٥ %)



إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية بقويستا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات العسكرية

م	البيد	الشركة المتقدمة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
١	المبنى التعليمي	مؤسسة ماريوتك	٩٩ %	
٢	مبنى الورش		٩٩ %	
٣	مبنى غرف الكهرباء		٨٢ %	
٤	خزان المياه الارضى		٨٤ %	
٥	ببارة الصرف الصحي		٨٤ %	
٦	الحائط الساتر		٧٥ %	
٧	أعمال الشبكات وتنسيق الموقع العام		٧٨ %	
نسبة تنفيذ المشروع			٨٥ %	

الموقف التنفيذي التفصيلي



إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية بقويسا
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى



مباني قائمة

- ١ المبنى التعليمي
- ٢ المبنى التعليمي الإداري
- ٣ مبنى الورش
- ٤ خزان حريق سعة (١٢٠) م^٣
(مطلوب رفع كفاءة + طلمبات حريق)
- ٥ خزانات دائرية متهاكة
(مطلوب إزالتها)

مساحة الموقع (٢١) فدان

مكونات الموقع العام بعد التطوير





كلية التكنولوجيا بنى سويف
نسبة التنفيذ (٨٨ %)

إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية ببنى سويف

الهيئة الهندسية للأغوات المساحة
إدارة المشروعات الحكرى

المواقع العام :



تقع الكلية التكنولوجية بمدينة بنى
سويق الجديدة على مساحة
(١٣٢٠٠) م٢ تقريباً (٣) فدان

المباني الحالية القائمة :

مبنى إدارى تعليمى
مكون من دور أرضى + (٢)
دور متكرر بمساحة
(٢٩٠٤) م٢ لكور الأرضى

إعادة تأهيل الكليات التكنولوجية ببنى سويف
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى



مكونات الموقع العام

- ١ منطقة انتظار سيارات
- ٢ انتظار سيارات خدمية
- ٣ المبنى التعليمي الإداري الجديد
- ٤ منطقة الملاعب الرياضية
- ٥ مسجد سعة (١٠٠) مصلى
- ٦ خزان مياه أرضي وحريق

المساحة الإجمالية للأرض
٢٥ ١٩٢٠٠

مساحة المبنى
التعليمي الإداري الجديد
٢٥ ٢٢٤٤

النسبة المبنية = ١٧%

الموقع العام يعد هدم المبنى القديم وإستغلال كامل المسطح لإنشاء مبنى جديد على مساحة ٢٢٤٤ م٢



إتحادة تأهيل الكليات التكنولوجية ببنى سويف
 الهيئة الهندسية لقاعات المسلحة
 إدارة المشروعات الكبرى



مسقط اقلى للدور الأرضى للتمينى التعليمى الإدارى الجديد ببنى سويف بمساحة (٢٢٦٤) م٢



المدينة الحديثة للخدمات المساحية
 إدارة المشروعات الكبرى
 مشروع مصر القومي للتهضة العلمية
 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

ميتى شئون الطلبة

٢٠٨٧٠ م

دور اليدروم

٢٠٨٧٠ م

الدور الأرضي

٢٠٨٦٠ م

أول

عدد (٣) دور

إجمالي مساحة ٢٦٠٠ م



المرحلة
الثانية



ثانياً:

المشروعات الكبرى على مستوى المراكز والمعاهد البحثية المركزية

مشروع إنشاء المحطة الأرضية للإستشعار
من البعد وعلوم الفضاء (مصر سات)





المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء

وترارة الدواع
الهيئة الهندسية لقوات المسلحة



هيئة الإستشعار من البعد	الجهة المستفيدة
شركات مدنية	الشركات المتقدمة
٥٥٠.٢٤ مليون جنيه	القيمة التقديرية للأعمال الجاري تنفيذها
٣٤١.٣٠ مليون جنيه	المبالغ الواردة
٢٠١٦/١٠/٠١	تاريخ بدء المشروع
٢٠٢٠/٠٦/٢٧	تاريخ الشهر المنتظر للأعمال الجاري تنفيذها
٢٠٢٠/٠١/٣١	تاريخ الشهر المنتظر لأعمال الغرق النظيف
٥٤ %	نسبة التنفيذ

- تشطيب وتجهيز مبنى تجميع وإختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AIT) .
- إنشاء مبنى التداخلات الكهرومقناطيسية التخصصية (EMC) .
- إنشاء مبنى محولات الكهرباء للمحطة الأرضية لمدينة العلوم القضائية (قدرة ١٠ ميجا ف.أ) .
- إنشاء مبنى المحولات لمباني تجميع الأقمار والتداخلات الكهرومقناطيسية (قدرة ٢ ميجا ف.أ) .
- إنشاء خزان حريق سعة ٥٠٠ م٣ .

المكونات الرئيسية للمشروع



تم عقد مؤتمر تنسيقي يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦ بحضور ممثلي الهيئة القومية للإستشعار من البعد و علوم القضاء وتم الإتفاق على الإلتزام بإنهاء جميع أعمال مبنى مركز تجميع وإختيار الأقمار الصناعية وأعمال البنية التحتية الخاصة به قبل موعد انتهاء ٢٠١٩/٠٩/٣٠ حتى يتسنى للجانب الصيني البدء في أعمال تركيب و تشغيل معدات المركز وتدريب العمالة المصرية عليها

تم الإتفاق بحضور ممثلي الهيئة القومية على أن يتم تحويل مبلغ (٢٠٠) مليون جنيه من مستحقات إدارة الأشغال العسكرية كدفعة عاجلة من المقاييسات الجارية تنفيذها وذلك قبل موعد ٢٠١٩/٠١/٣٠ حيث أن معظم المواد المستخدمة في تنفيذ مركز تجميع وإختيار و تكامل الأقمار الصناعية والبنية التحتية الخاصة به يتم إستيرادها من الخارج وتتطلب توافر تمويل كافى لفتح الإعتمادات المستقبلية لدى البنوك لتتم عملية الإستيراد خلال فترة من شهرين الى ثلاثة أشهر

تم طلب دفعة عاجلة (٢٠٠) مليون جنيه من الهيئة القومية للإستشعار من البعد و علوم القضاء يكتبها الهيئة الهندسية رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩ و ذلك لإستيراد المكونات اللازمة للإلتزام بالمخطط الزمني المتفق عليه مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد و علوم القضاء و الجانب الصيني و لم يتم موافقتنا بالمستحقات المالية حتى تاريخه


لم تقم الهيئة القومية للإستشعار من البعد و علوم القضاء بإستكمال تحويل الدفعة العاجلة المتفق عليها (٢٠٠ مليون جنيه قبل موعد ٢٠١٩/٠١/٣٠) حتى تاريخه (تم تحويل مبلغ ١٠٨ مليون جنيه حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٣)

تم الإتفاق مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد و علوم القضاء و الجانب الصيني بالإجتماعات المتعددة بمقر المحطة الأرضية في الفترة من ٢٠١٩/٠٤/٢٣ إلى ٢٠١٩/٠٤/٢٥ على عدد من التعديلات و على تهيؤ أعمال مركز تجميع وإختيار الأقمار الصناعية في موعد انتهاء ٢٠٢٠/٠٦/٢٧



المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وتلوم القضاء

وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

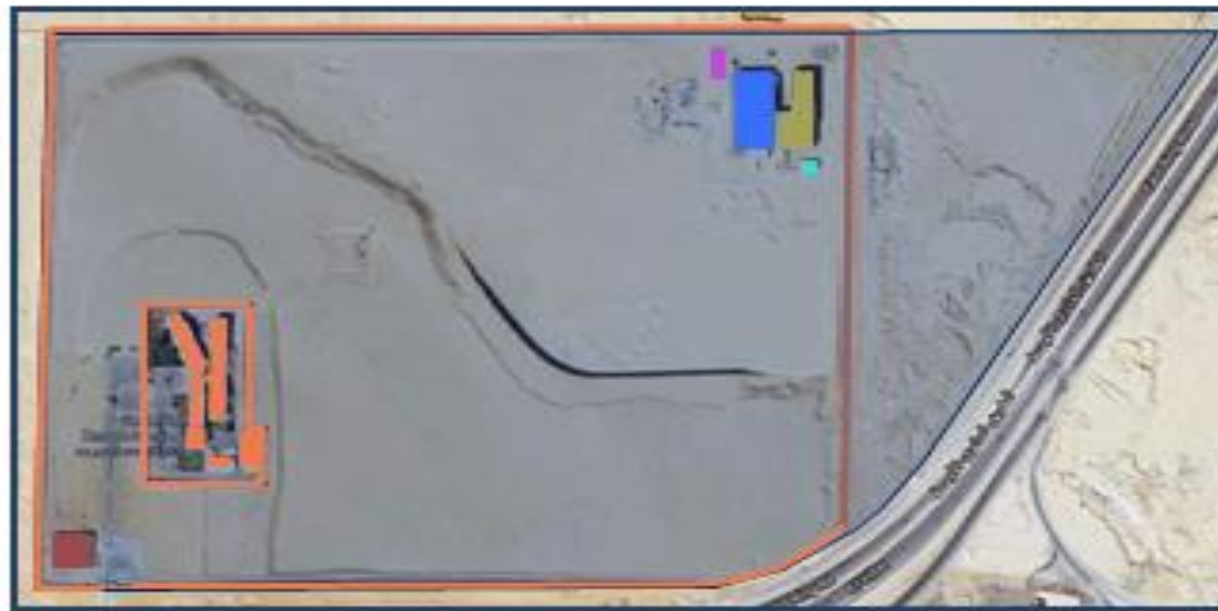

مبنى تجميع وإختبار وتكامل
 الأقمار الصناعية (AIT)

مبنى التداخلات الكهرومقناطيسية

مبنى المحولات الكهربائية
 للمحطة الأرضية

مبنى محولات الكهرباء لمبنى
 تجميع الأقمار الصناعية

خزان حريق

الأعمال السابق تنفيذها

جارى أعمال دراسة تصميم
 مخطط لكامل المدينة القضائية

المخطط العام للمرحلة الحالية



بيانات عامة عن المشروع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم القضاء

الجهة المائلة

الجانب الصيقي

إستشاري أعمال التصميمات
(٢٢٢ لوحة هندسية)

المجموعة الإستشارية شاكر

إستشاري مراجعة الأعمال
الإلكتروميكاتيكية و الإشراف على التنفيذ

شركات مدنية

المتقيد



الموقف المالي للمشروع



الموقف المالي للمشروع

٥٥٠.٢٤ مليون جنيه

القيمة التقديرية للأعمال الجارى تنفيذها

٣٤٦.٣٠ مليون جنيه

إجمالي المبالغ الواردة حتى تاريخه لصالح الأعمال الجارى تنفيذها

٤٩٥.٢٢ مليون جنيه

قيمة الدفعة المقدمة طبقاً للبروتوكول (٩٠%)

١٥٣.٩٢ مليون جنيه

المبالغ المطلوبة لإستكمال الدفعة المقدمة





١٢٠ مليون جنيه

أعمال الغرف التطبيقية

٢٥ مليون جنيه

أعمال التكييف المركزي
 وحدات إنتاج المياه المتلجة (Chillers) - طلمبات التدوير و التحويض - المبادل
 الحرارى (HeatExchanger) - الأنتاش الهوائية (Air Showers) -
 وحدات تنقية الهواء

٤٨ مليون جنيه

الأعمال الكهربائية و أعمال التيار الخفيف
 نظام الهواء المضغوط - إنذار الحريق - مكونات لوحة الكهرباء العمومية - معدات
 التيار الخفيف - الكشافات و البرايز و المفاتيح - الأوتاش - منظمات الجهد الكهربى

٧ مليون جنيه

نظام إدارة المبنى (BMS) طبقاً لطلبات الجانب الصينى

٢٠٠ مليون جنيه

الإجمالي



الموقف التنفيذي للمشروع


مركز تجميع وإختبار وتكامل الأقمار الصناعية

المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وتلوث القضاء
وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



منظور مركز تجميع وتكامل وإختبار الأقمار الصناعية

المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وتلوم القضاة
وتجارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

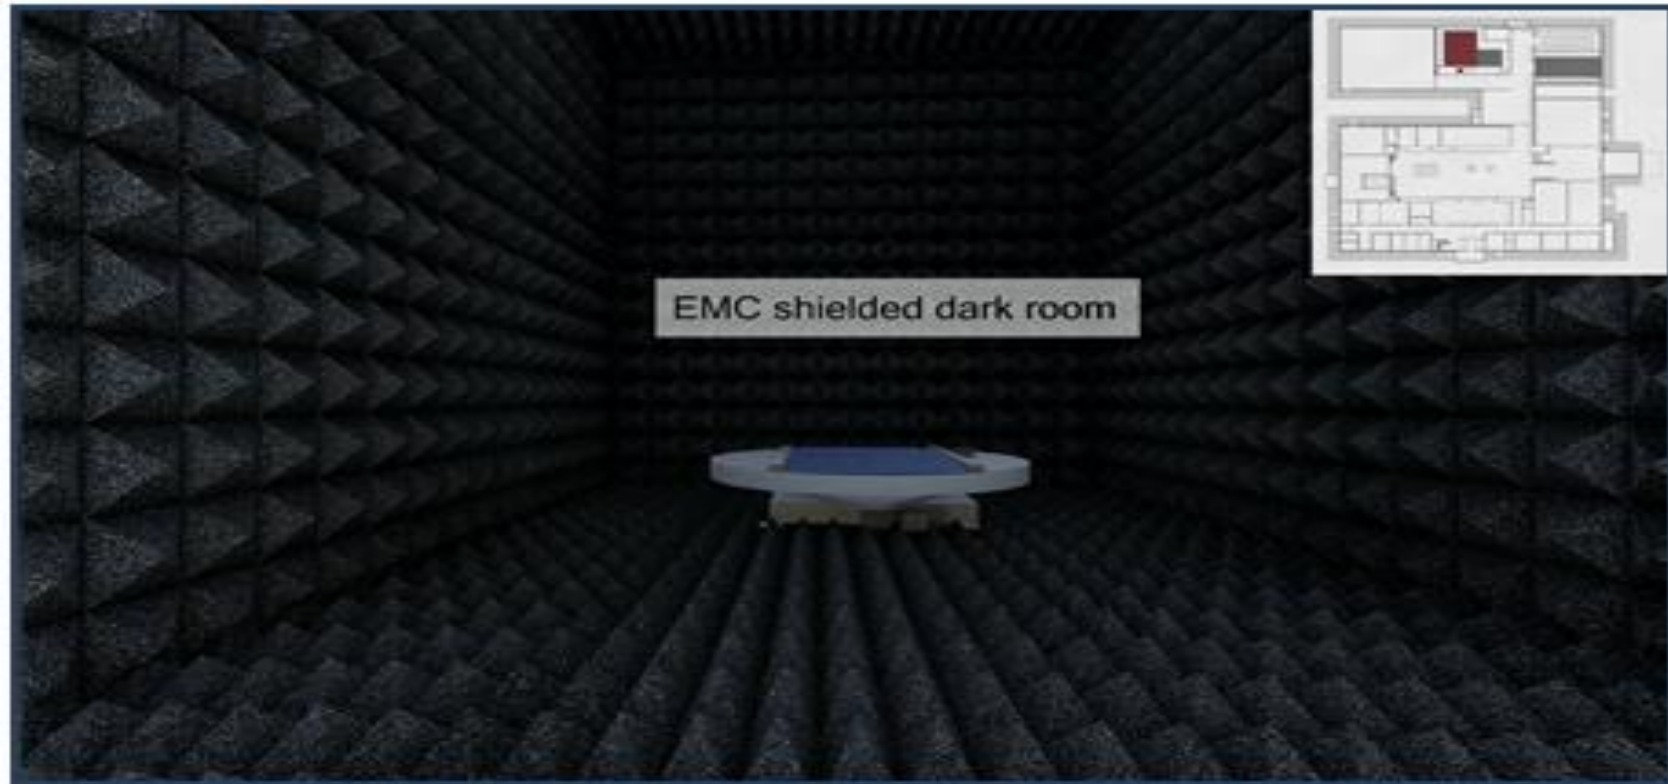

متطور غرفة التوافق الكهرومغناطيسي (غرفة مظلمة)



مبنى تجميع وإختبار وتكامل
الأقمار الصناعية (AIT)

نسبة التنفيذ ٥٥ %

تسمية التقنية ٥٥ ٠%

تشطيب مبنى تجميع وإختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AIT)

يتكون من دورين (أرضي بمساحة ٣٢٠٠ م^٢ – أول بمساحة ١٥٠٠ م^٢) ويشتمل على :

- منطقة تجميع رئيسية: غرفة نظيفة (Class ISO 8) وممر نظيف
- عدد (٣) غرفة تحكم لأنظمة المحاكاة وإختبارات الإهتزازات
- كبسولة محاكاة ظروف الفضاء (Thermal Vacuum Chamber)
- عدد (٣) غرفة تعقيم للأفراد
- غرفة تعقيم للمعدات
- عدد (٣) غرفة ماكينات: (طلميات – شيلرات – وحدات مناولة الهواء)
- عدد (٢) غرفة نظيفة للتخزين (Class ISO 8)
- عدد (٢) وتنش (٣ طن – ٥ طن)
- غرفة تغيير ملابس
- خدمات (مكافتيريا – حمامات – مصلى)

المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وعلوم القضاء

وتراصة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الموقف التنفيذي

٦٠ %

الأعمال الإحتياطية

تم التعاقد على عدد (٨) غرفة نظيفة و مخطط التوريد في شهر يوليو ٢٠١٩ و مخطط التركيب في شهر أغسطس ٢٠١٩
بشرط توريد الدفعات اللازمة لإتمام الإستيراد من الخارج بمبلغ (١٢٠) مليون جنيه

تم وصول عدد (٢) كونتينر يشتملان على الإكسسوارات الخاصة بالغرف النظيفة إلى ميناء الإسكندرية و جرى توريدهما للموقع

تم البدء في تغطية الواجهات الجانبية بالكلاش بعد اعتماد الجهة المائلة للعينة واللون المطلوب بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦

جارى أعمال العزل و الصب لأرضيات المضادة للكهرباء الإستاتيكية بالغرف النظيفة

تم عمل الرسومات التنفيذية للغرف النظيفة من قبل الجانب القرائي (مورد الغرف النظيفة)

جارى التعاقد على اللوح الحديد خاصة قاعدة قاعدة الهزاز ٤*٢ م ٢ سمك ١٠ سم سماحية ٠,١ مم (Shaker's steel plate)



وشرارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء



الموقف التقني

٥٥ %

الأعمال الإلكترونية وميكانيكية

تم توريد معدات نظام الهواء المضغوط


تم توريد لوحات الجهد المنخفض والمتوسط


تم توريد جميع الصاج و مواسير المياه المثلبة خاصة أعمال التكيف المركزي و مواسير نظام إطفاء الحريق و جاري التركيب

تم التعاقد على جميع أجهزة التيار الخفيف و جاري التوريد

تم التعاقد على أنظمة الصوت و الأمن

تم توريد جميع كشافات الإضاءة بالموقع





٩٢ ٪

إتشاء مبنى محولات الكهرباء للمحطة الأرضية لمدينة العلوم القضائية (قدرة ١٠ ميجا.ف.أ)

- عدد (٢) وحدة ربط حلقية (RMU)
- عدد (٦) منظم جهد كهربى (AVR)
- عدد (١) موزع رئيسى
- عدد (١) موزع قرامن
- عدد (٢) محول قدرة ٥٠٠ ك.ف.أ
- عدد (٢) مولد قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ
- عدد (٢) محول رفع قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ
- لوحات الجهد المتخفض
- كايالات جهد متوسط - متخفض
- نظام إنذار ومكافحة الحريق
- غرفة إدارية وحمام

الموقف التقني

- الأعمال الإلكترونية ميكانيكية ٩٠ ٪

- الهيكل الخرساني ١٠٠ ٪

- التشطيبات الداخلية ٩٥ ٪



الموقف التفقيي

تم توريد عدد (٦) منظم جهد كهربي بالموقع

تم توريد لوحة الكهرباء الرئيسية (MDB) بالموقع

تم توريد عدد (٢) محول رفع كهربي بالموقع

تم توريد عدد (٢) موزع (رئيسي - فرامتي)

تم توريد عدد (٤) لوحات ربط حلقية

جاري توريد عدد (٢) مولد كهربي



خزان تكديس المياه والحريق سعة (٥٠٠) م^٣

إنشاء خزان تكديس المياه والحريق سعة ٥٠٠ م^٣

- عدد (٢) حجرة مياه
- عدد (١) غرفة ظلّميات

الموقف التقني

- نسبة تنفيذ الأعمال الإحتياطية ١٠٠ %
- جاري تركيب الظلميات وشبكة المواسير



وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

المحطة الأرضية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء



٧٨

خزان تكديس المياه والحريق سعة ٥٠٠ م^٣



مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد
لمعهد بحوث الإلكترونيات




مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات
وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



موقع المشروع

وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

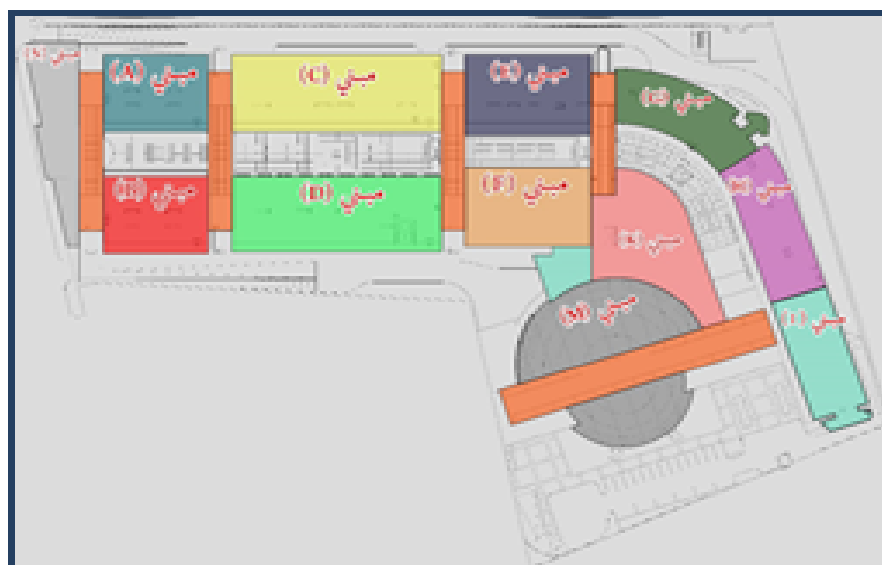

معهد بحوث الإلكترونيات	الجهة المستفيدة
شركات مستندية	الشركات المنقذة
المرحلة الأولى ٢٤٨,٤٦ مليون جنيه المرحلة الثانية ٣٧٣,١٧ مليون جنيه	القيمة التقديرية
المرحلة الأولى ٢٠٩,٤٥ مليون جنيه المرحلة الثانية ٣١٢,١٩ مليون جنيه	المبالغ الواردة
المرحلة الأولى ٢٠١٢/٠٢/٢٠ المرحلة الثانية ٢٠١٧/٠٥/٢٨	تاريخ بدء المشروع
المرحلة الأولى ٢٠١٧/١٢/٣١ المرحلة الثانية ٢٠١٩/١٠/٢٥	تاريخ التهور
المرحلة الأولى ٢٤ شهر المرحلة الثانية ٢٩ شهر	مدة تنفيذ المشروع
المرحلة الأولى ١٠٠ % المرحلة الثانية ٨٠ %	نسبة التنفيذ

المرحلة الأولى: أعمال تشطيب وتجهيز مباني :
 (A) أقسام المعهد البحثية - (B) أقسام المعهد البحثية - (S) مباني الخدمات المركزية
المرحلة الثانية: أعمال تشطيب وتجهيز مباني :
 (C) أقسام المعهد البحثية - (D) أقسام المعهد البحثية - الأسوار - الجراج

المكونات
 الرئيسية
 للمشروع



مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



- S** مبنى الخدمات والبيتية التحتية
- أقسام المعهد البحثية
A
B
C
D
- E** الحاضنات التكنولوجية
- F** العرفقة التطبيقية
- G** شركات إستشارية صناعية
- H** قى مجال الإلكترونيات
- I** تصميم الدوائر
- K** مركز تدريبي للصناعات الإلكترونية
- M** المكتبة المركزية
- M** مركز المؤتمرات

لقطة متطورة للمشروع



الموقف المالي للمشروع


مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد للمعهد بحوث الإلكترونيات

م	البيان	النسبة	المرحلة الأولى رقم التسليم الإبتدائي			المرحلة الثانية		
			القيمة (مليون جنيه)	البالغ (مليون جنيه)	المستحقات طبقاً للبروتوكول	القيمة (مليون جنيه)	البالغ (مليون جنيه)	المستحقات طبقاً للبروتوكول
١	الدفعة الأولى	٢٥ ٪	٦٢,١٢	٦٢,١٢	—	٩٣,٤٣	٩٣,٤٣	—
٢	الدفعة الثانية	٤٠ ٪	٩٩,٣٩	٩٩,٣٩	—	١٤٩,٥٠	١٤٩,٥٠	—
٣	الدفعة الثالثة	٢٠ ٪	٤٩,٦٩	٤٩,٦٩	١,٧٥	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٥,٤٩
٤	الدفعة الرابعة	٥ ٪	١٢,٤٢	—	١٢,٤٢	١٨,٦٩	١٨,٦٩	—
٥	الدفعة الخامسة	٥ ٪	١٢,٤٢	—	١٢,٤٢	١٨,٦٩	١٨,٦٩	—
٦	الدفعة السادسة	٥ ٪	١٢,٤٢	—	١٢,٤٢	١٨,٦٩	١٨,٦٩	—
الإجمالي			٢٤٨,٤٦	٢٠٩,٤٥	٢٦,٥٩	٣٧٣,٧٥	٣١٢,١٩	٢٤,١٨
إجمالي المبالغ المستحقة للمرحلتين (مليون جنيه)			٥٠,٧٧					

الموقف المالي للمشروع



المرحلة الأولى
مبنى (A – B – S)

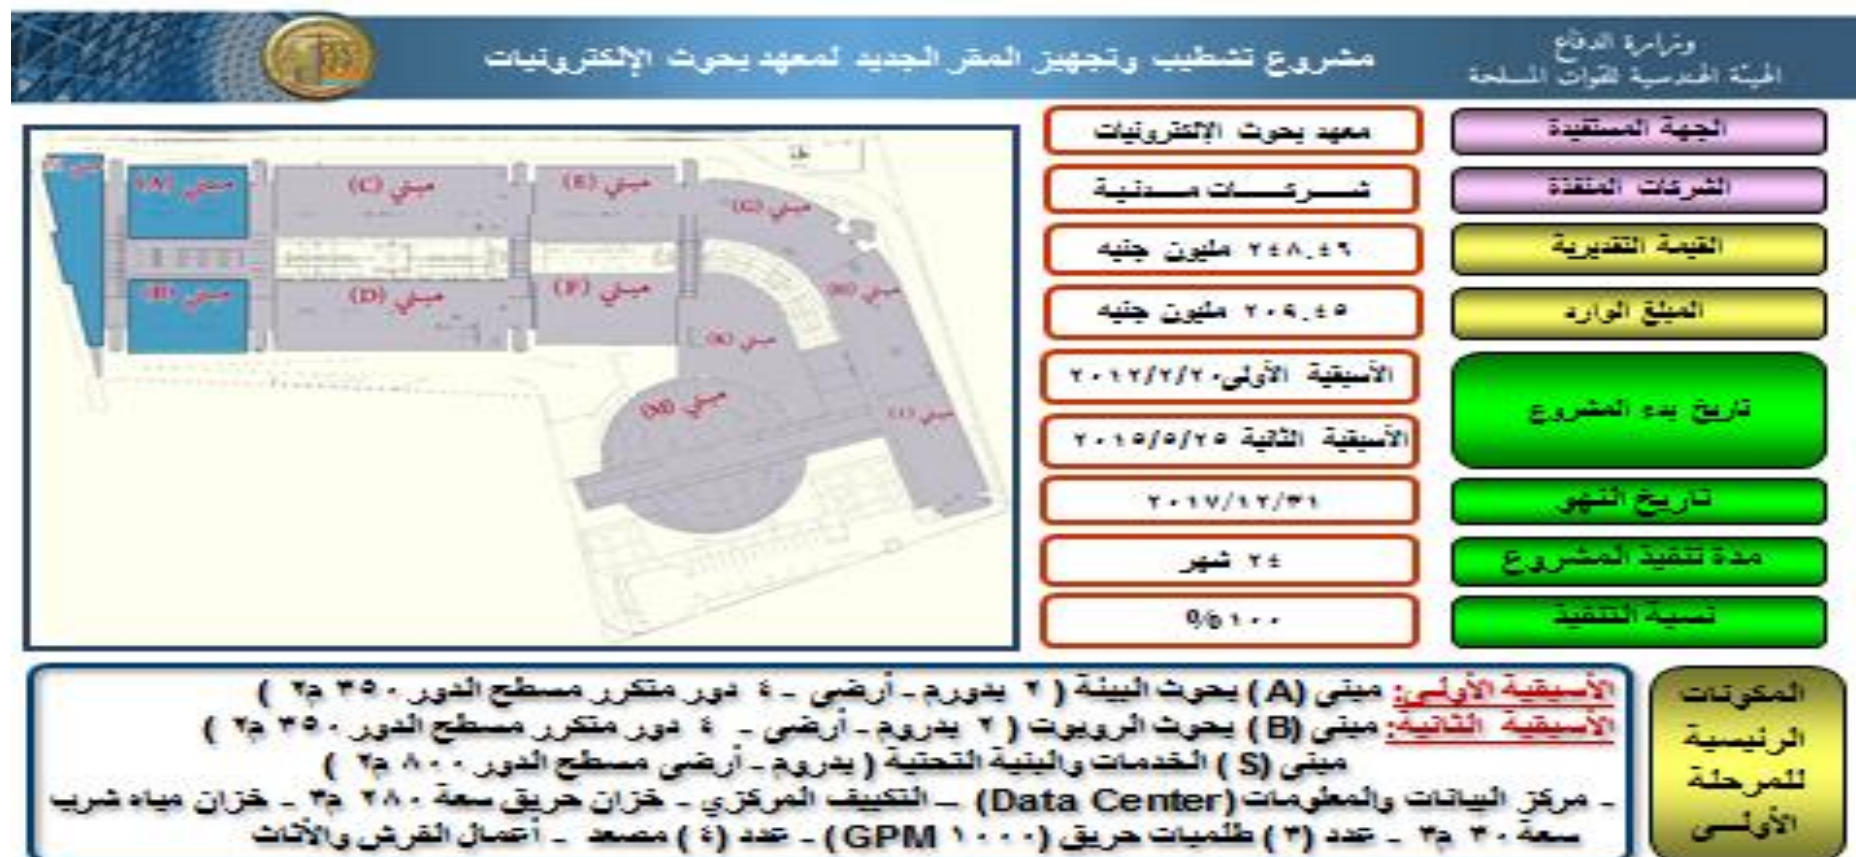

المرحلة الثانية
مبنى (C – D)

وتزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



شركات مدنية

۳۷۳.۹۷ ملیون جتيه

٣١٢,١٩ مليون جنيه

१०१४/०७/१४

१०१९/१०/१०

۷۹ شهر

0/0 1/1

الجهة المستفيدة

الشركات المتقدمة

القيمة التقديرية

المبيات الواردة

تاريخ بدء المشروع

تاریخ التہو

مدة تنفيذ المشروع

تصنيف: 310.31

- مکتبی (C) :

میتھی (D) :

- مركز البيانات في المعلي مات

الهيكل الإنشائي للخلايا الشمسية

- التمتع الإنشائي لا يعتمد في الكم

المكونات
الرئيسية
للمرحلة
الثانية

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات




المرحلة الأولى - مبنى (A - S)



الواجهات الخارجية



وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 مشروع تشطيب وتجهيز المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

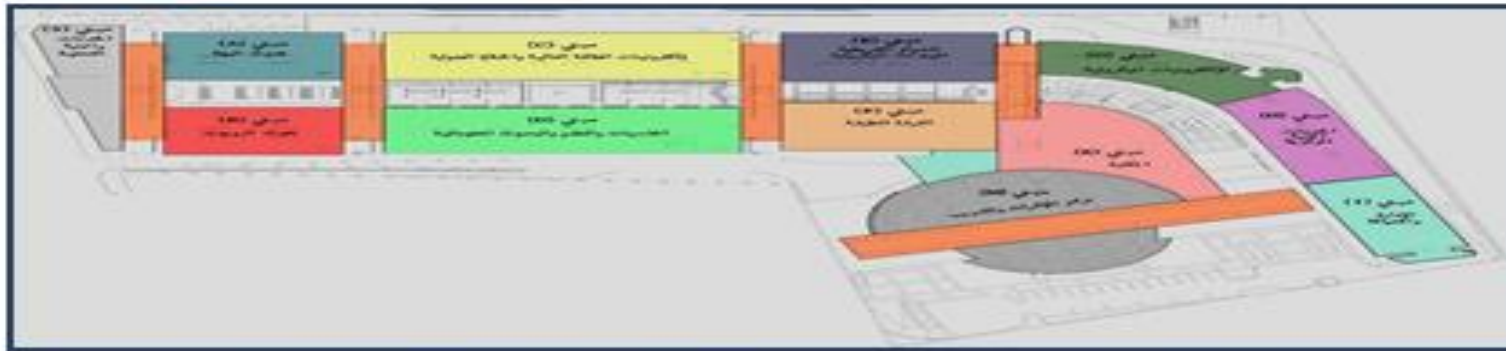

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

التكلفة التقديرية الميدانية لإستكمال تشطيب وتجهيز المراحل المستقبلية للمشروع

م	اسم المبنى	مسطح الدور (م ²)	عدد الأدوار	إجمالي المسطح	التكلفة بالجنية / م ²	إجمالي التكلفة بالمليون جنية
١	مبنى الحضانات التكنولوجية (E)	٩٣٠	٧	٤٤١٠	٤٩٨٠٠	٢١٩,٦
٢	مبنى الشرائع الإستشارية لصناعية للإلكترونيات (G)	٥٢٥	٧	٣٦٧٥		١٨٣
٣	مبنى تصميم الدوائر الإلكترونية (H)	٧٥٠	٧	٥٢٥٠		٢٦١,٥
٤	مبنى مركز تدريب الصناعات الإلكترونية (I)	٤٥٠	٧	٣١٥٠		١٥٦,٩
٥	مبنى المكتبة (K)	٨٣٥	٥	٤١٧٥		٢٠٧,٩
٦	مركز المؤتمرات (M)	١٧٠٠	٣	٥١٠٠		٢٥٤
الإجمالي						
٧	مبنى الغرفة النظيفة (F) (طبقاً لتقدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)					١٦٠٠
الإجمالي العام						
						٢٨٨٢,٩

الأكاديمية العليا للعلوم

الأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة



كلية الدراسات
العليا

مراكز التميز البحثي

وادي التكنولوجيا
(حضانات وشركات
صناعية)

الأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة

المساحات المطلوب تخصيصها لمباني أكاديمية الجلالة

تم تحديد المساحات بناءً على الفرضيات الآتية:

- العدد الكلي لطلاب الدراسات العليا: 1500 طالب وطالبة
- العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس: 150 وذلك لتحقيق نسبة الطالب للأستاذ 10 : 1
- 5 مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا التطبيقية (المساحة الكلية: 10686 م²)
- 3 مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية متخصصة في العلوم الأساسية (المساحة الكلية: 5862 م²)
- 2 مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية متخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية (المساحة الكلية: 1476 م²)
- قاعات التدريس، المكتبة، مركز المعلومات، ورش، استراحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب (المساحة الكلية: 5943 م²)
- وادي التكنولوجيا (المساحة الكلية: 2627 م²)
- مكاتب إدارية (المساحة الكلية: 1332 م²)
- مناطق خدمات عامة (المساحة الكلية: 6000 م²)

المساحة الكلية لأكاديمية الجلالة: (33926 م²)

المقترح المقدم يهدف لتخليق فراغات ديناميكية يمكن تغيير استخداماتها حسب تطور الاحتياجات في المجالات العلمية والبحثية المختلفة والمعنية بها أكاديمية الجلالة

الأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة

المساحات المطلوب تخصيصها لمباني أكاديمية الجلالة

تم تحديد المساحات بناءً على الفرضيات الآتية:

- العدد الكلي لطلاب الدراسات العليا: 1500 طالب وطالبة
- العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس: 150 وذلك لتحقيق نسبة الطالب للأستاذ 10 : 1
- 5 مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا التطبيقية (المساحة الكلية: 10686 م²)
- 3 مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية متخصصة في العلوم الأساسية (المساحة الكلية: 5862 م²)
- 2 مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية متخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية (المساحة الكلية: 1476 م²)
- قاعات التدريس، المكتبة، مركز المعلومات، ورش، استراحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب (المساحة الكلية: 5943 م²)
- وادي التكنولوجيا (المساحة الكلية: 2627 م²)
- مكاتب إدارية (المساحة الكلية: 1332 م²)
- مناطق خدمات عامة (المساحة الكلية: 6000 م²)

المساحة الكلية لأكاديمية الجلالة: (33926 م²)


المقترح المقدم يهدف لتخليق فراغات ديناميكية يمكن تغيير استخداماتها حسب تطور الاحتياجات في المجالات العلمية والبحثية المختلفة والمعنية بها أكاديمية الجلالة

الأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة



ويكون للأكاديمية مجلس إدارة مستقل تمثل فيه كليات جامعة الجلالة، الصناعات الإستراتيجية، الوزارات المعنية باهتمامات الأكاديمية والشخصيات العامة

محاور الاهتمام الأساسية للأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة



كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة

لابد أن يتوافر لدى الكلية المقومات الآتية:

1 آليات تحديد وتطوير برامج الدراسات العليا بما يتماشى مع أهداف الأكاديمية وجامعة لجلالة

2 أعضاء هيئة التدريس من داخل أو خارج جامعة الجلالة ممن لديهم تاريخ حافل في التعاون مع الصناعة ، القدرة علي تطويع البحث العلمي لحل التحديات الاستراتيجية في المجالات الحيوية التي تتفق مع خطط التنمية للدولة وتوفير التمويل للبحوث

3 آليات اختيار الطلاب ذوي المهارات العلمية والعملية ولديهم القدرة علي الإبداع والابتكار

4 القدرة علي تأهيل طلاب الدراسات العليا في مجالات الإهتمامات الأساسية لجامعة الجلالة

5 الإهتمام بالتطبيق العملي عن طريق ربط كلية الدراسات العليا بمراكز التميز البحثي ووادي التكنولوجيا

مراكز التميز البحثي بالأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة

مراكز بحثية متخصصة في مجالات الاهتمام الأساسية بجامعة الجلالة مجهزة بالإمكانات العملية المتقدمة التي تساعد علي تحويل مخرجات البحث العلمي إلى نموذج صناعي يتم نقله إلى المجتمع عن طريق وادي التكنولوجيا.

01

الباحثين ذوي الخبرات الدولية ولديهم سابق خبرة في مجالات اهتمام الأكاديمية التي تخدم أهداف الجامعة مع القدرة علي اجتذاب التمويل اللازم لإجراء البحوث.

02

آليات تمكن من الاستفادة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة ومراكز التميز البحثي ووادي التكنولوجيا بما يحقق أهداف الأكاديمية وجامعة الجلالة.

03

القدرة علي تطوير الصناعات القائمة (ذراع البحوث والتطوير للصناعة).

04

وادي التكنولوجيا بالأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية

تحويل النماذج البحثية إلى منتج متكامل عن طريق إنشاء شركات داخل الأكاديمية (حضانات تكنولوجية) أو إعطاء شريك من المجتمع حق استخدام المنتج البحثي

التواصل مع المجتمع وهيئات الدولة لتحديد الأولويات الاستراتيجية

توجيه مراكز التميز البحثي وكلية الدراسات العليا وكليات الجامعة إلى المجالات الحيوية التي تحتاج إلى حلول تعتمد على البحث العلمي والتطوير

توفير فرص لتمويل البحث العلمي داخل الأكاديمية عن طريق اجتذاب الاستثمارات والتواصل مع هيئات تمويل البحث العلمي

وَاللَّهُ وَلِيُّ
النَّوْفِقِ
